

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

وَمَا آتَاكَ بِشَاءٍ شَاءَ قَدَرٍ مَعِينٍ أَرْسَلَ نَزْلًا مِّنَ السَّمَاءِ مَدِينًا
مَّا بَرَأْنَا مِنْهُ كَبَاشٍ مَّا يَدْعُونَ

سوره مبارکه مومنون، آیه ۱۸



گزارشی از عملکرد پروژه‌های
شهری
شرکت آب و فاضلاب استان
لرستان
در سال ۱۴۰۴

شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

پروژه‌های آب و فاضلاب شهر خرم‌آباد

۱

پروژه‌های آب و فاضلاب شهر کوه‌دشت

۲


پروژه‌های آب و فاضلاب شهر الشتر

۳


پروژه‌های آب و فاضلاب شهر نورآباد

۴


پروژه‌های آب و فاضلاب شهر پلدختر




پروژه‌های آب و فاضلاب شهر دورود



پروژه‌های آب و فاضلاب شهر ازنا



پروژه‌های آب و فاضلاب شهر الیگودرز



ایجاد تاسیسات آب شهر خرم آباد

عنوان طرح :

پروژه‌های بخش آب شهر خرم آباد

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	خرم آباد	خط انتقال آب	طین سازه ماندگار	۱۷/۷۸۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۲۰	۱,۲۲۱۰	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۵,۵۷۶,۰۵۷	موقت ۲	۰	۶۹	۹۶
۲	آب	خرم آباد	خط انتقال آب	طین سازه ماندگار	۱۷/۹۴۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۹۰	۱,۱۵۷۳	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۶,۵۴۷,۵۰۰	موقت ۳	۰	۱۲۵	۱۱۲
۳	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طین سازه ماندگار	۱۷/۱۰۱۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۲۰	۱,۲۰۹۷	۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۴,۱۶۰,۴۳۴	موقت ۳	۰	۱۲۵	۱۲۲
۴	آب	خرم آباد	ساخت و تجهیز اتاقک چاهها	کسری سازه زاگرس	۱۷/۷۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۲۰	۱,۴۵۲۸	۲۶,۳۵۵,۷۴۳,۹۴۱	۲۲,۰۶۰,۳۱۸,۰۳۷	موقت ۶	۲۰۷۳۱۵۸۳۱۹۵	۸۰	۸۴
۵	آب	خرم آباد	احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی	آزنگ راه چمشک	۱۷/۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۰۰	۱,۷۹۱۰	۲۵۲,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۱۵,۴۱۹,۱۲۴	موقت ۵	۱,۳۴۴۱E+۱۱	۵۵	۸۵
۶	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	آرمان سازان آستیاگ	۱۷/۳۷۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۹۰	۱,۰۷۱۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۴,۶۵۴,۴۴۷	موقت ۳	۱۸۰۵۴۴۳۴۳۸	۱۲۵	۹۷
۷	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	بشت خرم اندیش	۱۷/۵۸۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳۶۵	۱,۱۰۰۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۷,۸۴۴,۱۲۴	موقت ۳	۴۲۶۶۴۵۰۲۴۹	۹۲	۸۷
۸	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طین سازه ماندگار	۱۷/۵۶۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۹۰	۱,۲۵۰۰	۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۵,۳۳۵,۴۳۷	موقت ۱	۰	۷۵	۷۹
۹	آب	خرم آباد	حصارکشی تاسیسات آب استان	کسری سازه زاگرس	۱۷/۶۹۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۴۰	۱,۵۰۴۳	۱۷,۱۶۳,۶۷۶,۹۸۲	۵,۷۱۸,۴۲۵,۸۵۴	موقت ۳	۲۵۰۳۲۸۴۴۲۱	۸	۳۳
۱۰	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	اوزن سازه سپهر	۱۷/۶۹۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۶۵	۱,۰۰۳	۳۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۳,۰۴۳,۲۷۵	موقت ۲	۱۱۷۶۷۰۲۰۴۷	۵۹	۲۰
۱۱	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	جهان ماندگار خیام	۱۷/۱۰۶۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۳۰۰	۰,۹۵۹۴	۱۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۲,۳۵۵,۲۴۴	موقت ۲	۱۲۴۴۶۰۳۸۸۰	۲۴	۴۷
۱۲	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طین سازه ماندگار	۱۷/۱۰۷۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۲۰	۰,۸۹۸۸	۹,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	موقت ۲	۱۲۵۴۹۴۱۰۴۵	۸۰	۶۵
۱۳	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طین سازه ماندگار	۱۷/۱۰۷۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۸۰	۰,۹۲۴۸	۳۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹,۶۴۹,۵۶۸	موقت ۲	۳۵۹۱۹۴۸۳۶۲	۱۰۰	۷۸
۱۴	آب	خرم آباد	اجرای خط انتقال آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۱۱۱۵۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸۰	۱,۱۰۱۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۷,۷۷۶,۳۲۸	موقت ۱	۳۰۸۲۹۶۷۱۲۸	۱۲۵	۷۸
۱۵	آب	خرم آباد	اجرای خط انتقال آب	طین سازه ماندگار	۱۷/۱۱۲۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۳۰۰	۱,۱۲۰۶	۳۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۹۹,۱۲۵,۴۸۷	موقت ۶	۱,۵۹۹۲E+۱۱	۱۲۳	۱۲۴
۱۶	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طین سازه ماندگار	۱۷/۳۷۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۹۰	۱,۳۰۰۰	۲۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۱,۷۰۱,۱۹۳	موقت ۱	۰	۸۱	۷۹
۱۷	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طین سازه ماندگار	۱۷/۳۷۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۹۰	۱,۳۰۹۷	۲۰,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۵,۵۹۵,۹۳۶	موقت ۱	۱۷۹۶۱۳۱۴۰۹	۹۵	۹۸
۱۸	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	ساروج کار بستر	۱۷/۴۹۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳۶۵	۱,۰۷۹۵	۲۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۴,۴۴۲,۹۵۵	موقت ۶	۸۳۸۷۵۴۳۵۲۳	۳۲	۸۲
۱۹	آب	خرم آباد	تخریب واحد فیلتراسیون تصفیه خانه آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۵۱۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۶۰	۱,۱۶۶۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۸,۶۵۲,۸۹۲	موقت ۱	۰	۷۰	۹۹
۲۰	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	آبادگران ولاش کوه	۱۷/۷۸۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۶۵	۱,۲۰۰۰	۲۰,۹۹۹,۸۲۵,۰۰۰	۱۹,۱۹۰,۰۲۸,۶۴۳	موقت ۳	۰	۲۵	۹۱
۲۱	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	کیان نوتاش ساز	۱۷/۸۲۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۳۶۵	۱,۳۴۷۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۶,۲۸۸,۳۰۱	موقت ۱	۰	۷۸	۳۷
۲۲	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	محسن ساخت	۱۷/۹۸۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳۶۵	۱,۲۹۸۱	۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۱۹	۰
۲۳	آب	خرم آباد	حصارکشی تاسیسات آب و فاضلاب	آبادگران ولاش کوه	۱۷/۲۳۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲۴۰	۱,۳۳۴۳	۱۹,۰۳۸,۷۷۲,۴۵۸	۱۳,۴۴۵,۷۷۹,۱۳۲	موقت ۲	۰	۱۷	۱۲
۲۴	آب	خرم آباد	حصارکشی تصفیه خانه آب و نگهداری	آرمان سازه شکیل	۱۷/۳۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۸۰	۱,۱۹۸۷	۶۵,۶۸۹,۸۹۰,۷۳۳	۰	-	۰	۱۲	۰
۲۵	آب	خرم آباد	احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی	طاق ساز	۱۷/۳۶۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳۰۰	۰,۹۷۷۲	۵۲۷,۷۰۶,۱۴۶,۷۰۰	۹۵,۵۲۴,۳۰۲,۳۸۵	موقت ۳	۲۵۰۴۶۸۶۴۹۳۸	۳۸	۱۸
۲۶	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	ریشه ساز	۱۷/۳۶۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۴۰	۱,۲۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹,۸۸۴,۵۶۶	موقت ۱	۸۷۷۵۸۶۴۹۳۶	۴۰	۵۰
۲۷	آب	خرم آباد	نقاط انفصال و اصلاح شبکه توزیع آب	طراحان نصر کوثر	۱۷/۴۶۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۸۰	۱,۱۹۵۷	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۱,۲۰۰,۰۵۸	موقت ۲	۱۴۴۶۳۰۹۹۴۳۵	۱۱۳	۸۳
۲۸	آب	خرم آباد	اجرای خط انتقال آب	سیبا سازان خرم	۱۷/۴۹۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۸۰	۱,۰۳۸	۲۸,۴۳۸,۵۱۲,۸۵۳	۲۵,۲۸۱,۳۵۷,۹۹۸	موقت ۲	۰	۶۱	۸۹
۲۹	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	سازه آب بیرانشهر	۱۷/۵۲۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۸۰	۱,۰۴۸۰	۸۰,۹۶۵,۲۹۶,۴۴۰	۰	-	۰	۵۰	۰
۳۰	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۵۸۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۸۰	۱,۴۹۰۰	۱۲۶,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۰
۳۱	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طین سازه ماندگار	۱۷/۶۶۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۸۰	۱,۱۷۵۲	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۶۶۵,۷۷۹,۲۴۷	موقت ۳	۰	۶۶	۹۴
۳۲	آب	خرم آباد	ساخت و تجهیز اتاقک چاه	دما تجهیز آب	۱۷/۶۸۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۸۰	۱,۳۷۲۲	۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۵۰	۰
۳۳	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	بشت خرم اندیش	۱۷/۷۲۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۸۰	۰,۹۷	۵۴,۴۸۹,۵۱۷,۹۳۷	۰	-	۰	۸	۰
۳۴	آب	خرم آباد	اجرای خط انتقال آب خاتم انبیا و ولعصر	سیبا سازان خرم	۱۷/۷۲۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸۰	۱	۲۰۱,۱۶۷,۷۷۹,۸۷۷	۳۸,۷۹۶,۱۹۲,۳۱۹	موقت ۱	۵۳۴۶۰۵۳۳۴۸۰	۲۵	۱۹
۳۵	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب جلال	آرمان سازان آستیاگ	۱۷/۷۳۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸۰	۱,۱۳۳۸	۲۲۲,۹۰۷,۰۲۰,۳۷۳	۰	-	۰	۰	۰
۳۶	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	ساروج کار بستر	۱۷/۹۸۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۸۰	۱,۱۲۶۱	۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۲۲	۰
۳۷	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	تحکیم سازه سپهر افلاک	۱۷/۱۱۱۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۸۰	۰,۹۴۰۰	۳۷,۴۲۹,۰۳۵,۵۴۲	۰	-	۰	۰	۰
۳۸	آب	خرم آباد	ساخت و بازسازی حوضه شیرآلات	پهین ناظران ایرانپان	۱۷/۱۱۳۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۲۷۰	۱,۴۰۰۱	۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۰
۳۹	آب	خرم آباد	ساخت و بازسازی حوضه شیرآلات	راهان دژ غدیر پارس	۱۷/۱۱۴۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۲۷۰	۱,۲۶۱۶	۲۷,۲۰۳,۰۸۶,۶۶۱	۰	-	۰	۰	۰

شرح عملیات اجرایی:

- عملیات اجرایی احداث مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی فلک الدین و کوی آبشار (مسکن ملی) ۴۰٪
- اجرای ۳۹۱۸ مترمکعب مخزن ذخیره آب
- لوله گذاری خطوط انتقال آب به طول ۱۰۷۳۶ متر
- اجرای شبکه توزیع آب بطول ۱۱۰۷۲ متر
- نصب ۴۰۷ فقره انشعابات آب به طول ۲۵۶۱ متر
- احداث ۱۳ عدد حوضچه شیر آلات
- حفاری و تجهیز و نیرورسانی ۴ حلقه چاه آب در سطح شهر

ایجاد تاسیسات آب شهر فره آباد

خطوط انتقال آب

اصلاح شبکه آب

مخزن بتنی ۵۰۰۰ مترمکعبی فلک الدین



خطوط انتقال آب منطقه پاگر



خطوط انتقال آب



ایجاد تاسیسات آب شهر فره آباد



ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	فاضلاب	استان	تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب ۵ شهر	مهرآز سامان	۱۷/۴۹۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۷۳۰		#####	-		۰	۳	۰
۲	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کیان نوتاش ساز	۱۷/۹۴۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۸۰	۰,۹۴۰۶	۴۵,۶۱۴,۱۲۷,۹۸۷	۴۹,۵۲۴,۶۶۸,۴۱۷	موقت ۹	۳۴,۰۴۸,۲۲۸,۴۳۳	۹۷	۱۰۹
۳	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	نگین کوشا الوند	۱۷/۱۱۱۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸۰	۰,۹۱۶۷	۴۵,۹۹۳,۳۱۰,۹۵۴	۴۷,۲۹۳,۹۹۲,۳۰۷	موقت ۸	۱۱۷,۲۶۲,۰۲۵,۵۵۶	۸۶	۱۰۲
۴	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	بتن آرمه لرستان	۱۷/۱۲۲۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸۰	۰,۸۹۷۳	۴۴,۹۷۱,۹۶۹,۰۶۶	۲۳,۳۶۵,۶۴۵,۳۲۲	موقت ۴	۲۱۷۳,۰۷۲,۸۶۰۶	۱۰۰	۵۲
۵	فاضلاب	خرم آباد	عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب	بهین ناظران ایرانیان	۱۷/۳۹۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۸۰	۱,۳۰۰۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۴,۹۳۷,۰۵۷	موقت ۳	۰	۵۰	۱۰۱
۶	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کیان نوتاش ساز	۱۷/۶۹۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۸۰	۱,۰۰۳۴	۲۰,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۳,۱۳۹,۳۵۳	موقت ۶	۱۱۵,۴۵۸,۲۶۹۵	۱۲۳	۱۱۸
۷	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کوه پیماسازان لرستان	۱۷/۷۴۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸۰	۰,۸۱۸۶	۷۱,۳۳۱,۳۱۴,۸۴۳	۳۸,۹۰۵,۲۶۸,۶۳۳	موقت ۵	۲۲۸,۲۴۸,۱۹۴۰	۳۶	۵۵
۸	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۱۱۰۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۸۰	۱/۴۱۹۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۲,۱۴۱,۹۱۰	موقت ۱	۰	۱۷	۰
۹	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	بتن آرمه لرستان	۱۷/۴۲۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸۰	۱,۱۱۵۳	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۲,۰۹۷,۱۸۸	موقت ۲	۰	۱۰۵	۱۰۴
۱۰	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	تحکیم سازه سپهر افلاک	۱۷/۵۰۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۸۰	۱,۰۵۴۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۶,۸۳۸,۰۸۳	موقت ۵	۱۰۷۰۴۴۷۲۰۰	۹۰	۸۹
۱۱	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	سازه آب بیرانشهر	۱۷/۵۳۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۸۰	۰,۸۲۲۰	۱۰۶,۸۱۷,۹۹۵,۴۳۳	-		۰	۱۱	۰
۱۲	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	سازه آب بیرانشهر	۱۷/۱۰۱۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۸۰	۰,۸۲۴۰	۱۰۵,۷۱۶,۱۸۱,۶۱۷	-		۰	۰	۰

شرح عملیات اجرایی:

- لوله گذاری خطوط اصلی فاضلاب به طول ۱۸۸۱ متر
- لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول ۱۳۰۰۵ متر
- احداث ۱۴۰۶ عدد دال و فوتینگ منهول های فاضلابی



ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر خره آباد



شبکه جمع آوری فاضلاب



شبکه جمع آوری فاضلاب



عملیات غرقاب



منهول فاضلابی

عنوان طرح :

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

— لوله گذاری خطوط انتقال آب به طول ۱۷۸۰ متر

— اجرای شبکه توزیع آب بطول ۴۵۵۰ متر

— نصب ۳۲۵ فقره انشعابات آب به طول ۱۴۸۵ متر

— احداث ۱۱ عدد حوضچه شیر آلات

شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

— عملیات اجرایی ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی ۲۳

درصدی در بخش سیویل

— لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول ۱۶۳۰ متر



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر پلدختر

عنوان طرح :

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر پلدختر

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	پلدختر	اصلاح شبکه توزیع آب	کیان پایدار ماهان	۱۷/۸۷۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳۶۵	۰,۹۵۰۰	۲۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۹,۳۷۳,۳۰۵	موقت ۱۲	۴۲۷۳۲۵۸۷۴۷	۶۴	۴۴
۲	آب	پلدختر	خط انتقال آب	بهین ناظران ایرانیان	۱۷/۹۸۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۴۰	۰,۹۸۱	۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۷,۵۴۷,۹۳۶	موقت ۴	۷۴۰۶۸۵۷۸۶	۱۲۵	۵۱
۳	آب	پلدختر	اصلاح شبکه توزیع آب	کیان پایدار ماهان	۱۷/۹۹۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۴۰	۱/۱۲۹۷	۱۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۷,۹۱۵,۹۲۴	موقت ۶	۰	۶۹	۷۰
۴	آب	پلدختر	احداث ساختمان پیزومتری چاه	پندار سازه توان	۱۷/۵۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۸۰	۲,۲۸	۲۳,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۵	۰
۵	آب	پلدختر	اصلاح شبکه توزیع آب	عمران خاک کوه‌دشت	۱۷/۷۳۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸۰	۱,۱۵۰۰	۸۶,۸۲۸,۹۱۵,۹۳۷	-	-	۰	۴۱	۰
۶	آب	پلدختر	اصلاح شبکه توزیع آب	پندار سازه توان	۱۷/۱۱۴۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۸۰	۰,۸۹۸۵	۱۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۷	۰

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	فاضلاب	پلدختر	تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب	راه گسترگرین	۱۷/۳۰۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸۰	۱,۲۶	۳۷۹,۸۷۵,۲۴۴,۸۲۶	۳۵,۶۴۹,۲۲۷,۶۳۵	موقت ۱	۰	۳۱	۹

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر پلدختر

ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب



ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب



خط فاضلاب زندان



خط فاضلاب زندان

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر معمولان

عنوان طرح :



شرح عملیات اجرایی بخش آب:

– لوله گذاری خطوط انتقال آب به طول ۴۴۶ متر

– اجرای شبکه توزیع آب بطول ۱۲۵۰ متر

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر معمولان

عنوان طرح :

پروژه‌های بخش آب شهر معمولان

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	معمولان	تکمیل خط انتقال آب	پندار سازه توان	۱۷/۱۰۱۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۲۰	۱,۲۰۳۸	۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۲۰۴,۰۹۳	موقت ۱	۰	۱۰۰	۵۹
۲	آب	معمولان	خط انتقال آب	شالوده گستر افلاک	۱۷/۴۹۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۸۰	۱,۴۰۵۳	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۹,۴۸۴,۰۰۰	موقت ۱	۳۰۷۸۲۱۵۷۵۵	۹۶	۱۰۰
۳	آب	معمولان	اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب	رایان اکسیر گوارا	۱۷/۸۰۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۸۰	۰,۸۹۶۷	۲۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۰	۱۴	۰
۴	آب	معمولان	تکمیل خط انتقال آب	ایجاد سازه خرم	۱۷/۹۹۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۸۰	۰,۹۶۴۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۰	۱۵	۰

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

– لوله گذاری خطوط انتقال آب به طول ۳۰۰ متر

– اجرای شبکه توزیع آب بطول ۵۱۶۹ متر

– نصب ۱۲۲ فقره انشعابات آب به طول ۸۷۵ متر

– احداث ۱۶ عدد حوضچه شیرآلات

شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

– عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی ۹۴

درصدی در بخش سیویل

– لوله گذاری خطوط اصلی فاضلاب به طول ۵۵۰ متر

– لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول ۱۴۵۰ متر



پاکسازی سازه های تصفیه خانه فاضلاب

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر کوهدشت

عنوان طرح :

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر کوهدشت

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	کوهدشت	اصلاح شبکه توزیع آب	عمران گستر غرب	۱۷/۷۸۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۳۶۵	۱,۶۳۵۶	۶۵,۷۰۱,۸۴۲,۰۶۴	۵۹,۶۶۹,۰۶۸,۷۸۲	موقت ۷	۳۰۶۸۱۱۵۱۶۴۸	۱۲۵	۹۱
۲	آب	کوهدشت	اصلاح شبکه توزیع آب	پارسه سازه گرد	۱۷/۱۱۱۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰۰	۱,۴۴۵۰	۱۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۱,۷۸۵,۳۰۳	موقت ۲	۲۴۰۲۹۶۴۱۲۴	۲۷	۶۳
۳	آب	کوهدشت	نیروورسانی	پویا الکتریک باختر	۱۷/۳۲۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶۰	۱,۲۰۸۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۳۳۶,۹۰۴	موقت ۱	۰	۱۰۰	۷۱
۴	آب	کوهدشت	اصلاح شبکه توزیع آب	عمران خاک کوهدشت	۱۷/۳۶۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۸۰	۱,۰۹۷	۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۵۲۷,۴۰۷	موقت ۱	۰	۶۶	۱۰۰
۵	آب	کوهدشت	اصلاح شبکه توزیع آب	یافته گستر عمران خرم	۱۷/۸۸۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۸۰	۱,۰۷۹۵	۵۵,۸۸۷,۳۶۹,۷۴۹	-		۰	۴۴	۰
۶	آب	کوهدشت	خط انتقال و ساخت اتاقک چاه	عمارت صنعت زیوار	۱۷/۱۰۹۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۸۰	۱,۱۱۷۸	۲۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۰	۰	۰

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	فاضلاب	کوهدشت	شبکه جمع آوری فاضلاب	کاسیت سازه زاگرس	۱۷/۱۱۰۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۸۰	۱,۱۶۹۶	۵۸,۴۴۷,۶۰۴,۱۴۴	۴۲,۴۲۲,۸۹۸,۹۸۰	موقت ۱۱	۴۰۶۵۹۲۷۰۱۰۰	۳۸	۷۳
۲	فاضلاب	کوهدشت	شبکه جمع آوری فاضلاب	کاسیت سازه زاگرس	۱۷/۱۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۸۰	۱,۲۳۹۳	۶۰,۸۴۲,۷۳۲,۴۰۳	۴۳,۸۵۱,۹۶۵,۸۲۰	موقت ۱۱	۳۰۲۳۰۹۷۲۶۶۷	۸۲	۷۲

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر کوهدشت



تصفیه خانه فاضلاب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر کوهدشت



اصلاح شبکه آب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر نورآباد

عنوان طرح :

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

— اجرای شبکه توزیع آب بطول ۱۴۰۰ متر

— نصب ۱۳۵ فقره انشعابات آب به طول ۱۰۵۰ متر

— احداث ۲ عدد حوضچه شیرآلات



شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

— عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصدی

در بخش سیویل

عنوان طرح :

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر نورآباد

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر نورآباد

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	نورآباد	اصلاح شبکه توزیع آب	یشت خرم اندیش	۱۷/۸۴۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۳۶۵	۱,۶۶۰۰	۷۳,۳۲۳,۳۰۶,۶۸۸	۴۱,۵۶۱,۳۰۷,۹۰۹	موقت ۳	۱۷۳۹۱۲۱۲۶۶۸	۵۲	۵۷
۲	آب	نورآباد	اصلاح شبکه توزیع آب	محسن ساخت	۱۷/۱۰۵۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۴۰	۱,۵۰۱۵	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۲,۴۵۹,۳۹۹	موقت ۱	۰	۳۹	۱۱۳

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	فاضلاب	نورآباد	تصفیه خانه فاضلاب	راه و ساختمانی شماره ۱۲۳ خرم آباد	۱۷/۱۰۱۶۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۷۳۰	۱,۸۲۷۲	۷۰۸,۴۰۷,۴۱۰,۱۳۸	۵۷۱,۰۸۹,۱۳۴,۲۵۴	موقت ۲۱	۴.۴۴۱۳۴E+۱۱	۸۳	۸۱
۲	فاضلاب	نورآباد	شبکه جمع آوری فاضلاب	راه و ساختمانی شماره ۱۲۳ خرم آباد	۱۷/۵۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۸۰	۰,۸۹۲۸	۱۸۴,۹۸۷,۷۱۱,۹۹۲	-		۰	۰	۰

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر نورآباد



تصفیه خانه فاضلاب



عنوان طرح :

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الشتر

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

— اجرای شبکه توزیع آب بطول **۲۳۱۳** متر

— احداث **۲** عدد حوضچه شیر آلات

شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

— عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با

پیشرفت فیزیکی **۵۳** درصدی در بخش سیویل



عنوان طرح :

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر الشتر

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	الشتر	اصلاح شبکه توزیع آب	فرداد بنا لرستان	۱۷/۸۷۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳۶۵	۱,۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۱۸۲,۹۸۴	موقت ۳	۷۱۰۵۶۰۰۱۳۱	۲۱	۳۸
۲	آب	الشتر	اصلاح شبکه توزیع آب	نیک اسکان خاوران	۱۷/۳۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۲۰	۱/۳۵۲۹	۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۲,۵۸۸,۰۱۳	موقت ۴	۰	۱۲۵	۱۱۵
۳	آب	الشتر	ساخت و تجهیز و راه اندازی اتاقک چاه	دما تجهیز آب	۱۷/۶۷۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۸۰	۱,۳۶۱۲	۲۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۰	۷۰	۰

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	فاضلاب	الشتر	تصفیه خانه فاضلاب	راه و ساختمانی شماره ۱۲۳ خرم آباد	۱۷/۱۲۴۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۳۶۵	۱,۶۱۸۷	۸۰۶,۱۷۶,۰۰۰,۵۵۲	۲۲۲,۴۷۸,۳۲۵,۳۵۴	موقت ۶	##### ##	۴۴	۲۸

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الشتر



تصفیه خانه فاضلاب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر دورود

عنوان طرح :



شرح عملیات اجرایی بخش آب:

— اجرای شبکه توزیع آب بطول ۹۵۰ متر

— احداث ۴ عدد حوضچه شیر آلات

شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

— عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی

۳۵ درصدی در بخش سیویل

— عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب با پیشرفت فیزیکی

۶۵ درصدی در بخش سیویل

— لوله گذاری خطوط اصلی فاضلاب به طول ۱۹۰ متر

— لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول ۶۶۹۰ متر

عنوان طرح :

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر دورود

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر دورود

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	دورود	تامین آب شرب	کسری سازه زاگرس	۱۷/۶۴۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۲۰	۱,۲۸۱۵	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۸۵۶,۹۹۴	موقت ۲	۱۸۶۸۶۸۷۱۳۴	۳۵	۶۸
۲	آب	دورود	حصارکشی	مقاوم سازان آرات	۱۷/۷۶۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۳۶۵	۱,۱۶۵۱	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۳,۹۶۶,۵۳۲	موقت ۲	۰	۲۰	۶۷
۳	آب	دورود	اصلاح شبکه توزیع آب	نگین شهر آرتین	۱۷/۵۶۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۳۶۵	۱,۰۴۲۲	۲۰,۷۳۹,۷۷۹,۹۹۶	۱۳,۴۸۳,۴۵۸,۰۱۳	موقت ۳	۰	۳۴	۶۵
۴	آب	دورود	اصلاح شبکه توزیع آب	راه و ساختمان تعاونی شماره ۹۴ خرم‌آباد	۱۷/۵۶۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸۰	۱,۱۳۷۴	۲۵,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۷۰	۰
۵	آب	دورود	تکمیل خط انتقال آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۷۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۸۰	۱,۳۹۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۶۰	۰
۶	آب	دورود	ساخت و بازسازی حوضچه شیرآلات	کوشش سازه لرستان	۱۷/۱۱۳۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲۷۰	۱,۴۰۱۱	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	۰
۷	آب	دورود	خط انتقال آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۱۱۵۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۸۰	۱,۳۹۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	۰

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۲۹۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸۰	۰,۹۱۹۲	۵۰,۰۸۳,۱۹۷,۹۶۵	۴۵,۶۸۵,۴۲۳,۳۲۰	موقت ۳	۰	۱۱۸	۹۱
۲	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	بهینه سازه متین	۱۷/۳۴۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸۰	۱,۲۷۸۰	۷۳,۸۹۲,۳۴۸,۳۹۶	۷۱,۴۷۸,۶۶۲,۳۹۸	موقت ۱۰	۰	۱۲۵	۹۷
۳	فاضلاب	دورود	ایستگاه پمپاژ ps۲	ویرا تدبیر آرکان	۱۷/۹۴۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۸۰	۱,۶۰۵۲	۱۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۶۵,۹۸۶,۸۰۶	موقت ۱۰	۰	۵۱	۳۴
۴	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کسری سازه زاگرس	۱۷/۴۶۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۸۰	۱,۱۰۳۰	۲۰,۴۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۲۰,۷۵۴,۴۱۹,۷۰۸	موقت ۴	۶۷۶۹۰۵۱۸۷۳	۸۴	۱۰۱
۵	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۶۶۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱۸۰	۱,۳۲۴۲	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۷,۰۷۱,۷۸۱	موقت ۱	۰	۳۳	۹۹
۶	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	ژرف اندیشان فیروزی	۱۷/۴۲۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸۰	۱,۱۰۷۶	۱۸۹,۹۷۷,۳۱۱,۲۱۴	-	-	۰	۵۷	۰
۷	فاضلاب	دورود	ساخت دال و فوتینگ فاضلابی	بابک ساروج لرستان	۱۷/۶۳۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۸۰	۱,۱۴۵۰	۱۲۹,۸۲۵,۸۵۱,۲۵۵	-	-	۰	۵۶	۰
۸	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۷۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۸۰	۱,۱۰۰۴	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۹۰	۰
۹	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	تحکیم پویش رستا	۱۷/۸۰۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۸۰	۰,۸۶۳۱	۱۳۳,۳۰۲,۳۵۹,۳۹۰	۳۰,۱۵۹,۱۶۴,۵۹۶	موقت ۱	۰	۵	۲۳
۱۰	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۱۱۵۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۸۰	۱,۳۰۰۸	۲۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۲۲	۰

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر دورود



تصفیه خانه فاضلاب




ایستگاه پمپاژ فاضلاب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر دورود



شبکه فاضلاب و مرمت نوار حفاری

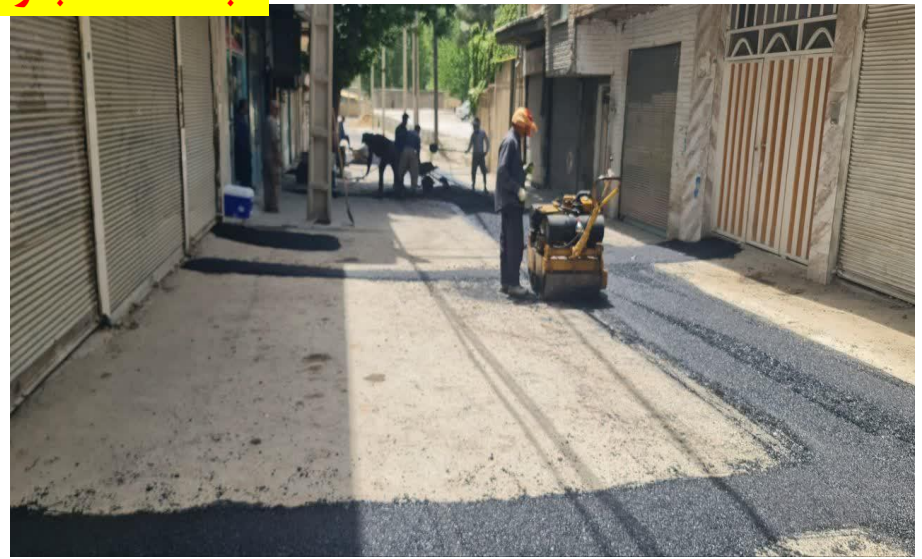

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر ازنا

عنوان طرح :

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

— اجرای شبکه توزیع آب بطول **۲۷۰۰** متر

— نصب **۱۹۰** فقره انشعابات آب به طول **۱۱۴۰** متر

— احداث **۲۰** عدد حوضچه شیر آلات

شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

— عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با

پیشرفت فیزیکی **۸۴** درصدی در بخش سیویل



عنوان طرح :

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر ازنا

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر ازنا

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	ازنا	نصب پکیج تصفیه آب	برین پالاد	۱۷/۹۳۵۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۲۴۰	۱,۱۰۸۱	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۶,۷۳۶,۰۰۰	موقت ۲	۱۱۷۶۷۰۲۰۴۷	۱۰۰	۶۹
۲	آب	ازنا	اصلاح شبکه توزیع آب	کسری سازه زاگرس	۱۷/۳۸۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۴۰	۱,۴۸۶۳	۵۰,۶۲۶,۲۹۰,۷۶۹	۵۲,۱۸۷,۳۸۰,۹۸۸	موقت ۸	۷۶۱۶۰۹۵۹۲	۶۰	۱۰۳
۳	آب	ازنا	اصلاح شبکه توزیع آب	نیکنام ازنا گستر	۱۷/۶۳۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۳۶۵	۱,۱۳۵۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۰	۵۸	۰
۴	آب	ازنا	اصلاح شبکه توزیع آب	پویا رهرو تابش	۱۷/۵۱۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳۶۵	۱,۱۲۰۰	۲۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۱,۲۹۶,۶۲۰	موقت ۱	۰	۵۵	۷۳
۵	آب	ازنا	ساخت، بازسازی و مریی سازی حوضچه‌های آب	پویا رهرو تابش	۱۷/۵۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۴۰	۱,۵۲۰۰	۴,۹۸۸,۱۲۳,۱۵۵	-		۰	۰	۰
۶	آب	ازنا	ایستگاه پمپاژ آب کمندان	راه و ساختمان تعاونی شماره ۹۴ خرم‌آباد	۱۷/۵۶۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۰	۱,۴۹۸۳	۲۸,۴۶۶,۶۶۶,۶۷۷	-		۰	۱۰۰	۰
۷	آب	ازنا	خط انتقال ایستگاه پمپاژ اضطراری	راه و ساختمان تعاونی شماره ۹۴ خرم‌آباد	۱۷/۵۹۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۲۰	۱,۵۲۷۲	۲۸,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-		۰	۷۵	۰
۸	آب	ازنا	اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب	راه و ساختمان تعاونی شماره ۹۴ خرم‌آباد	۱۷/۶۷۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۸۰	۱,۵۵۵۷	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۰	۲۰	۰
۹	آب	ازنا	تکمیل و راه‌اندازی پکیج تصفیه آب	رامان بنای تدبیر	۱۷/۸۳۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۸۰	۱,۶۸۲۴	۲۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۰	۵	۰

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	فاضلاب	ازنا	تصفیه خانه فاضلاب	توسعه گستران سپاهان	۱۷/۱۱۸۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۳۶۵	۱,۸۴۴۸	۵۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۷۲,۲۵۱,۸۶۷	موقت ۴	۰	۶۱	۵۸

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر ازنا



تصفیه خانه فاضلاب



اصلاح شبکه آب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الیگودرز

عنوان طرح :

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

– اجرای شبکه توزیع آب بطول **۳۷۰ متر**

– عملیات اجرایی احداث مخزن **۵۰۰۰ مترمکعبی**

– اجرای **۱۵۰۰ مترمکعب** مخزن ذخیره آب

شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

– لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول **۹۲۲۰ متر**

– لوله گذاری خطوط اصلی فاضلاب به طول **۱۲۵۰ متر**

– احداث **۴۲۰ عدد** دال و فوتینگ منهول های فاضلابی



عنوان طرح :

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الیگودرز

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر الیگودرز

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	الیگودرز	احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی	راه گسترگرین	۱۷/۴۲۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۳۶۵	۱,۳۹۰۰	۱۶۵,۵۰۸,۶۱۷,۴۲۸	۱۱۸,۶۴۷,۰۲۱,۶۸۲	موقت ۸	۰	۹۲	۷۲
۲	آب	الیگودرز	اصلاح شبکه توزیع آب	کاسیت راه افلاک	۱۷/۸۰۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۳۶۵	۱,۰۸۰۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۷	-	-	۰	۰	۰
۳	آب	الیگودرز	اصلاح شبکه توزیع آب	سپید صنعت پیشرو بیدستان	۱۷/۱۰۳۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۰۰	۱,۹۸۰۰	۷,۸۱۳,۰۴۷,۴۸۸	-	-	۰	۴	۰
۴	آب	الیگودرز	اصلاح شبکه توزیع آب	ژرف اندیشان فیروزی	۱۷/۱۱۳۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۶۵	۱/۳۹۹۹	۲۰,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۱۵	۰

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	فاضلاب	الیگودرز	ترمیم و مرمت نوار حفاری و آسفالت	زیبا سازان پایدار اراک	۱۷/۹۸۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۶۰	۱,۴۹۹۶	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۰۸۶,۸۰۸	موقت ۱	۰	۴۵	۳۳
۲	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	ژرف اندیشان فیروزی	۱۷/۵۶۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۳۶۵	۰,۷۹۴۷	۴۰,۳۹۲,۴۶۵,۰۱۵	۱۷,۳۱۳,۳۹۶,۹۸۱	موقت ۴	۸۰۴۰۲۴۵۸۲۸۰	۵۹	۴۳
۳	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	پندار سازه توان	۱۷/۶۰۴۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۳۶۵	۰,۸۲۰۰	۴۱,۶۲۶,۰۲۴,۴۶۰	۴۱,۰۳۲,۸۳۹,۹۶۴	موقت ۱۱	۴۴۷۴۲۲۷۵۵۳۲	۶۶	۹۹
۴	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کیان پایدار ماهان	۱۷/۶۸۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۸۰	۱,۰۰۶	۷۰,۷۲۳,۴۴۹,۵۸۸	۶۴,۷۸۳,۹۶۱,۰۵۱	موقت ۱۰	۰	۸۷	۹۲
۵	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	پندار سازه توان	۱۷/۱۰۳۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۸۰	۰,۹۱۵۰	۸۱,۰۷۶,۶۴۰,۱۷۷	۱۱,۷۵۶,۱۱۲,۸۲۶	موقت ۱	۰	۸۱	۱۵
۶	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کوشش سازه لرستان	۱۷/۳۶۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۸۰	۰,۹۱۹۰	۲۳۷,۵۰۵,۵۱۲,۶۵۲	۵۳,۴۹۰,۵۶۲,۹۳۴	موقت ۱	۰	۷۴	۲۳
۷	فاضلاب	الیگودرز	ساخت دال و فونینگ فاضلابی	ژرف اندیشان فیروزی	۱۷/۵۹۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۸۰	۱,۱۵۱۹	۱۳۲,۹۶۳,۶۹۵,۲۹۰	۱۲,۳۷۳,۱۳۳,۸۵۰	موقت ۱	۰	۵۰	۹

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الیگودرز

عنوان طرح :



مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی



شبکه جمع آوری فاضلاب



خدا ما حنان کن سرانجام کار
تو خوشو دباشی و مار سگار

