

سُبِّحْ لِلَّهِ الْحَمْدُ

وَمَا آتَىٰ رَأْسُهَا إِلَّا شَاهِدٌ عَلَىٰ مَنْ فِي الْأَرْضِ أَنْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسُخِّرَ بِهِ نَبَاتٍ لَّهَا خِصْفٌ عَلَىٰ يَافُوسٍ

سوره مبارکه مومنون، آیه ۱۸



گزارشی از عملکرد پروژه‌های شهری شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

پروژه‌های آب و فاضلاب شهر خرم‌آباد

۱

پروژه‌های آب و فاضلاب شهر کوه‌دشت

۲


پروژه‌های آب و فاضلاب شهر الشتر

۳


پروژه‌های آب و فاضلاب شهر نورآباد

۴


پروژه‌های آب و فاضلاب شهر پلدختر




پروژه‌های آب و فاضلاب شهر دورود



پروژه‌های آب و فاضلاب شهر ازنا



پروژه‌های آب و فاضلاب شهر الیگودرز



ایجاد تاسیسات آب شهر خرم آباد

عنوان طرح :

پروژه‌های بخش آب شهر خرم آباد

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	خرم‌آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۶۶۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸۰	۱,۱۷۵۲	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۸۸,۱۸۴,۰۲۴	موقت ۱	-	۲۶	۲۹
۲	آب	خرم‌آباد	حصارکشی تاسیسات آب و فاضلاب	آبادگران ولاش کوه	۱۷/۳۳۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۴۰	۱,۳۳۶۴	۱۰۰,۰۳۸,۷۷۲,۴۵۸	-	موقت ۱	-	۱۵	۰
۳	آب	خرم‌آباد	حصارکشی تصفیه خانه آب و نگهبانی	آرمان سازه شکیل	۱۷/۳۵۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸۰	۱,۱۹۸۷	۶۵,۶۸۹,۸۹۰,۷۳۳	-	موقت ۱	-	۱۰	۰
۴	آب	خرم‌آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	بشت خرم اندیش	۱۷/۵۸۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳۶۵	۱,۱	۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۱۱۵,۸۹۶	موقت ۱	-	۹۲	۶۸
۵	آب	خرم‌آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۵۶۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۹۰	۱,۳۵	۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۵,۳۳۵,۴۳۷	موقت ۱	-	۷۵	۷۹
۶	آب	خرم‌آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	اوزن سازه سپهر	۱۷/۶۹۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۶۵	۱,۰۳	۳۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۲,۰۴۳,۳۷۵	موقت ۲	۱,۱۷۶,۷۰۲,۰۴۷	۵۵	۲۰
۷	آب	خرم‌آباد	حصارکشی تاسیسات آب استان	کسری سازه زاگرس	۱۷/۶۹۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۴۰	۱,۵۰۴۳	۱۷,۱۶۳,۶۷۶,۹۸۲	۵,۷۱۸,۴۲۵,۸۵۴	موقت ۳	۲,۰۸۵,۱۰۹,۴۳۶	۸	۳۳
۸	آب	خرم‌آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۱۰۷۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۲۰	۱,۰۹۸۸	۱۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۱,۷۶۵,۸۳۴	موقت ۲	۱,۲۵۴,۹۴۱,۰۴۵	۸۰	۶۵
۹	آب	خرم‌آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۱۰۷۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۸۰	۰,۹۲۴۸	۳۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۶,۴۹۹,۵۶۸	موقت ۲	۳,۵۹۱,۹۴۸,۴۳۲	۱۰۰	۷۸
۱۰	آب	خرم‌آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	جهان ماندگار خیام	۱۷/۱۰۶۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۳۰۰	۰,۹۵۹۴	۱۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۲,۳۵۵,۳۴۴	موقت ۲	۱,۳۴۴,۶۰۳,۸۸۰	۲۴	۴۷
۱۱	آب	خرم‌آباد	اجرای خط انتقال آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۱۱۱۵۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۸	۱۸۰	۱,۱۰۱۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۷,۷۷۶,۳۲۸	موقت ۱	۳,۰۸۲,۹۶۷,۱۲۸	۱۲۵	۷۸
۱۲	آب	خرم‌آباد	اجرای خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۱۱۲۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۳۰۰	۱,۱۲۰۶	۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۵,۷۴۱,۴۵۶	موقت ۵	-	۱۲۳	۱۲۱
۱۳	آب	خرم‌آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	آرمان سازان آستیاک	۱۷/۱۲۷۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۹۰	۱,۰۷۱	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۴,۶۵۴,۴۴۷	موقت ۳	۱,۸۰۵,۴۴۳,۴۳۸	۱۲۵	۹۷
۱۴	آب	خرم‌آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۱۲۷۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۹۰	۱,۳	۲۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۱,۲۰۱,۱۹۳	موقت ۱	-	۸۱	۷۹
۱۵	آب	خرم‌آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۱۲۷۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۹۰	۱,۳۰۹۷	۲۰,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۵,۹۵۵,۹۳۶	موقت ۱	۱,۷۹۶,۱۳۱,۴۰۹	۹۵	۹۸
۱۶	آب	خرم‌آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	ساروج کار بستر	۱۷/۲۹۸۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۳۶۵	۱,۰۷۹۵	۳۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۴,۴۴۳,۹۵۵	موقت ۶	۷۴۰,۶۸۵,۷۸۶	۳۲	۸۲
۱۷	آب	خرم‌آباد	تخریب واحد فیلتراسیون تصفیه خانه آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۵۱۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۶۰	۱,۱۶۶۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موقت ۱	-	۲۰	۹۹
۱۸	آب	خرم‌آباد	خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۷۸۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۲۰	۱,۳۲۱	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۵,۷۶۰,۵۷	موقت ۲	-	۶۹	۹۶
۱۹	آب	خرم‌آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	طراحان نصر کوثر	۱۷/۶۸۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۳۶۵	۱,۱۶۰۲	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۴,۰۰۳,۳۳۳	موقت ۴	۱,۷۹۶,۱۳۱,۴۰۹	۱۲۵	۶۷
۲۰	آب	خرم‌آباد	خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۹۴۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۹۰	۱,۱۵۷۳	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۶,۴۷۵,۰۰	موقت ۳	-	۱۲۵	۱۱۲
۲۱	آب	خرم‌آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۱۰۱۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۲۰	۱,۳۰۹۷	۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۴,۱۶۰,۴۴۴	موقت ۳	-	۱۲۵	۱۱۲
۲۲	آب	خرم‌آباد	ساخت و تجهیز اتاقک چاهها	کسری سازه زاگرس	۱۷/۷۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۲۰	۱,۴۵۲۸	۲۶,۳۵۵,۷۳۳,۴۹۱	۸,۷۱۹,۶۱۲,۹۸۶	موقت ۳	۱۶,۳۴۶,۸۳۰,۶۸۳	۸۰	۳۳
۲۳	آب	خرم‌آباد	احداث مغزن ۵۰۰۰ متر مکعبی	ازنگ راه چمشک	۱۷/۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۰۰	۱,۷۹۱	۲۵,۴۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۳,۹۷۴,۹۹۵	موقت ۴	-	۴۳	۷۲
۲۴	آب	خرم‌آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	کیان توانلس ساز	۱۷/۸۲۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۳۶۵	۱,۳۴۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۶,۳۸۸,۲۰۱	موقت ۱	-	۱۰	۳۷
۲۵	آب	خرم‌آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	محسن ساخت	۱۷/۹۴۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۶۵	۱,۲۹۸۱	۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقت ۱	-	۶	۰
۲۶	آب	خرم‌آباد	احداث مغزن ۵۰۰۰ متر مکعبی	طاق ساز	۱۷/۲۶۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۳۰۰	۰,۹۷۲۲	۵۳,۲۷۰,۶۱۲,۶۷۰	۶۸,۵۷۹,۳۴۵,۳۷۲	موقت ۲	۱۷,۳۹۱,۲۱۲,۶۶۸	۳۰	۱۳
۲۷	آب	خرم‌آباد	اجرای خط انتقال و بهسازی چشمه آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۱۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۸۰	۱,۳۰۴۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۹,۳۴۶,۲۵۲	موقت ۱	-	۸۵	۶۳
۲۸	آب	خرم‌آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	ریشه ساز	۱۷/۲۶۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲۴۰	۱,۲۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۸۸۴,۵۶۶	موقت ۱	۸۷۷,۵۸۶,۴۴۶	۴۰	۵۰
۲۹	آب	خرم‌آباد	نقاط انقباض و اصلاح شبکه توزیع آب	طراحان نصر کوثر	۱۷/۲۶۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۸۰	۱,۱۵۷۷	۲۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	موقت ۲	۱۴,۴۴۲,۸۹۴,۳۲۵	۹۰	۸۳
۳۰	آب	خرم‌آباد	اجرای خط انتقال آب	سپیا سازان خرم	۱۷/۹۸۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۸۰	۱,۳۸	۲۸,۴۳۸,۵۲۲,۵۵۳	۱۹,۸۴۹,۳۳۲,۹۹۷	موقت ۱	-	۶۱	۷۰
۳۱	آب	خرم‌آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	آبادگران ولاش کوه	۱۷/۷۸۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۳۶۵	۱,۲	۲۰,۰۹۹,۸۲۵,۰۰۰	-	موقت ۱	-	۲۵	۰
۳۲	آب	خرم‌آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	سازه آب بیرانشهر	۱۷/۵۲۵۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۸۰	۱,۰۴۸۰	۸۰,۹۵۵,۲۹۶,۴۴۰	-	موقت ۱	-	۲۵	۰
۳۳	آب	خرم‌آباد	تکمیل خط انتقال آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۵۸۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸۰	۱,۴۹	۱۲,۶۵۰,۱۰۰,۰۰۰	-	موقت ۱	-	۰	۰
۳۴	آب	خرم‌آباد	تکمیل خط انتقال آب جلال	آرمان سازان آستیاک	۱۷/۲۷۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۸۰	۱,۱۳۳۸	۳۲۲,۹۰۷,۰۲۰,۳۷۳	-	موقت ۱	-	۰	۰
۳۵	آب	خرم‌آباد	ساخت و تجهیز اتاق چاه	دما تجهیز آب	۱۷/۲۷۵۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۸۰	۱,۳۷۴۲	۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقت ۱	-	۰	۰
۳۶	آب	خرم‌آباد	اجرای خط انتقال آب خانما و ولیعصر	سپیا سازان خرم	۱۷/۲۷۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۸۰	۱	۲۰۰,۱۶۷,۷۷۹,۸۷۷	۳۸,۹۷۶,۱۹۳,۳۱۹	موقت ۱	۵۳,۶۴۰,۵۳۳,۴۸۰	۱۱	۱۹
۳۷	آب	خرم‌آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	ساروج کار بستر	۱۷/۹۸۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸۰	۱,۱۲۶۱	۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقت ۱	-	۰	۰
۳۸	آب	خرم‌آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	بشت خرم اندیش	۱۷/۲۲۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۸۰	۰,۹۷	۵۴,۴۸۹,۵۱۷,۲۷	-	موقت ۱	-	۸	۰

شرح عملیات اجرایی:

— عملیات اجرایی احداث مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی فلک الدین و کوی آبشار (مسکن ملی)

— اجرای ۳۰۰۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب

— لوله گذاری خطوط انتقال آب به طول ۷۷۰۰ متر

— اجرای شبکه توزیع آب بطول ۷۶۸۷ متر

— نصب ۱۵۵ فقره انشعابات آب به طول ۸۶۶ متر

— احداث ۱۳ عدد حوضچه شیر آلات

— حفاری و تجهیز و نیرورسانی ۴ حلقه چاه آب در سطح شهر

ایجاد تاسیسات آب شهر فره آباد

خطوط انتقال آب

اصلاح شبکه آب

مخزن بتنی ۵۰۰۰ مترمکعبی فلک الدین



خطوط انتقال آب منطقه پاگر



خطوط انتقال آب



ایجاد تاسیسات آب شهر فره آباد



ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	فاضلاب	خرم آباد	عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب	بهین ناظران ایرانیان	۱۷/۳۹۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۸۰	۱۳۰۰۵	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۳۰۴۰۹۳۷۰۰۵۷	موقت ۳	-	۵۰	۱۰۱
۲	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	بتن آرمه لرستان	۱۷/۱۲۲۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸۰	۰۸۹۷۳	۴۴۰۹۷۱۰۹۶۹۰۰۶۶	۲۳۰۳۶۵۰۶۴۵۰۳۲۲	موقت ۴	۱۵۰۴۱۰۳۹۹۰۷۸۴	۱۰۰	۵۲
۳	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کیان نوتاش ساز	۱۷/۹۴۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۸۰	۰۹۴۰۶	۴۵۰۶۱۴۰۱۲۷۰۹۸۷	۴۹۰۵۲۴۰۶۶۸۰۴۱۷	موقت ۹	۳۲۰۶۴۱۰۱۶۰۵۴۷	۹۷	۱۰۹
۴	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	نگین کوشا الوند	۱۷/۱۱۱۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸۰	۰۹۱۶۷	۴۵۰۹۹۳۰۳۱۰۰۹۵۴	۴۷۰۲۹۳۰۹۹۲۰۳۰۷	موقت ۸	۱۱۰۷۲۶۰۲۰۲۰۵۵۶	۸۶	۱۰۲
۵	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کوه پیماسازان لرستان	۱۷/۷۴۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸۰	۰۸۱۸۶	۷۱۰۳۳۱۰۳۱۴۰۴۳	۳۸۰۹۰۵۰۲۶۸۰۶۳۳	موقت ۵	۲۰۲۸۲۰۴۸۱۰۹۴۰	۳۳	۵۵
۶	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کیان نوتاش ساز	۱۷/۶۹۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۸۰	۱۰۰۳۴	۲۰۰۹۹۹۰۹۰۰۰۰۰	۱۳۰۵۶۶۰۰۸۶۰۵۲۸	موقت ۴	۱۰۱۵۴۰۵۸۳۰۶۹۵	۱۱۵	۶۵
۷	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۱۱۰۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۸۰	۱/۴۱۹۹	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۷۷۲۰۱۴۱۰۹۱۰	موقت ۱	-	۱۷	۰
۸	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	بتن آرمه لرستان	۱۷/۴۲۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸۰	۱۰۱۱۵۳	۲۸۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۵۶۲۰۰۹۷۰۱۸۸	موقت ۲	-	۷۹	۱۰۴
۹	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	تحکیم سازه سپهر افلاک	۱۷/۵۰۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۸۰	۱۰۵۴۰	۲۸۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۵۷۴۰۳۷۰۰۵۹۲	موقت ۳	-	۵۱	۴۴
۱۰	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	سازه آب بیرانشهر	۱۷/۵۳۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۸۰	۰۸۲۲۰	۱۰۶۸۱۷۰۹۹۵۰۴۳۳	-	-	-	۱	۰
۱۱	فاضلاب	خرم آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	سازه آب بیرانشهر	۱۷/۸۷۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۸۰	۱۰۱۲۴۲	۳۶۰۶۶۹۰۱۳۰۰۴۳۶	۱۸۰۱۸۹۷۰۰۰۱۱۹	موقت ۲	۷۵۰۴۱۲۰۲۳۵۰۷۹۷	۸۰	۵۰

شرح عملیات اجرایی:

- لوله گذاری خطوط اصلی فاضلاب به طول **۱۷۵۶ متر**
- لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول **۱۱۴۹۵ متر**
- ساخت **۱۴۰۶** عدد دال و فوتینگ منهول های فاضلابی



ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر خره آباد



شبکه جمع آوری فاضلاب



شبکه جمع آوری فاضلاب



عملیات غرقاب



منهول فاضلابی

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر پلدختر

عنوان طرح :

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

- لوله گذاری خطوط انتقال آب به طول ۱۸۷۶ متر
- اجرای شبکه توزیع آب بطول ۲۹۲۰ متر
- نصب ۱۵۰ فقره انشعابات آب به طول ۶۹۵ متر
- احداث ۶ عدد حوضچه شیرآلات

شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

- عملیات اجرایی ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی ۱۴

درصدی در بخش سیویل

- لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول ۱۶۳۰ متر



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر پلدختر


عنوان طرح :

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر پلدختر و معمولان

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	فاضلاب	پلدختر	تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب	راه گستر گرین	۱۷/۳۰۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸۰	۱۲۶	۳۷۹,۸۷۵,۲۴۴,۸۲۶	۳۵,۶۴۹,۲۲۷,۶۳۵	موقت ۱	-	۲۵	۹
۲	آب	پلدختر	اصلاح شبکه توزیع آب	کیان پایدار ماهان	۱۷/۸۷۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳۶۵	۰,۹۵	۲۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۱,۷۶۵,۴۰۰	موقت ۹	۳,۴۰۳,۹۶۴,۱۲۴	۵۰	۲۴
۳	آب	پلدختر	خط انتقال آب	بهین ناظران ایرانیان	۱۷/۹۸۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۴۰	۰,۹۸۱	۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۵,۳۴۳,۴۲۶	موقت ۳	۷۴۰,۶۸۵,۷۸۶	۱۲۵	۳۳
۴	آب	پلدختر	اصلاح شبکه توزیع آب	کیان پایدار ماهان	۱۷/۹۹۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۴۰	۱/۱۲۹۷	۱۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۱,۶۹۸,۲۰۴	موقت ۵	-	۶۲	۵۲
۵	آب	پلدختر	احداث ساختمان پیرومتری چاه	پندار سازه توان	۱۷/۵۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۸۰	۲,۲۸	۲۳,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰
۶	آب	پلدختر	اصلاح شبکه توزیع آب	عمران خاک کوه‌دشت	۱۷/۷۳۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸۰	۱,۱۵	۸۶,۸۲۸,۹۱۵,۹۳۷	-	-	-	۱۳	۰
۷	آب	معمولان	تکمیل خط انتقال آب	پندار سازه توان	۱۷/۱۰۱۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۲۰	۱,۲۰۳۸	۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۲۰۴,۰۹۳	موقت ۱	-	۱۰۰	۵۹
۸	آب	معمولان	خط انتقال آب	شالوده گستر افلاک	۱۷/۴۹۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۸۰	۱,۴۰۵۳	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۹,۴۸۴,۰۰۰	موقت ۱	۳۰۰۷۸,۲۱۵,۷۵۵	۹۶	۱۰۰
۹	آب	معمولان	تکمیل خط انتقال آب	ایجاد سازه خرم	۱۷/۹۱۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۸۰	۰,۹۶۴۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰
۱۰	آب	معمولان	اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب	رایان اکسیر گوارا	۱۷/۸۰۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۸۰	۰,۸۹۶۷	۲۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸	۰

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر پلدختر

ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب

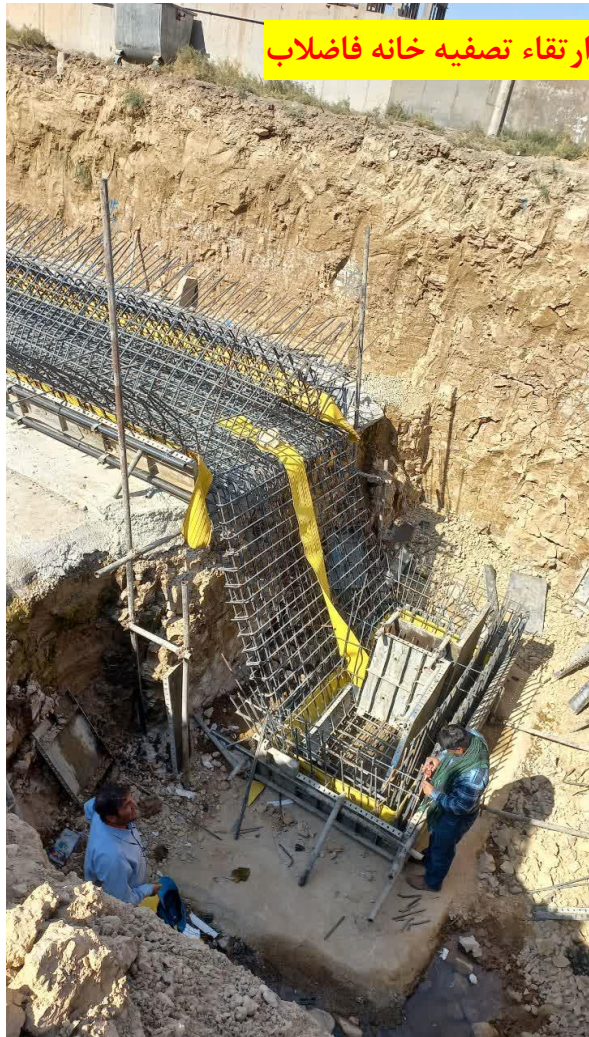

ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب



خط فاضلاب زندان



خط فاضلاب زندان

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

– لوله گذاری خطوط انتقال آب به طول ۳۰۰ متر

– اجرای شبکه توزیع آب بطول ۴۹۶۹ متر

– نصب ۱۲۲ فقره انشعابات آب به طول ۸۷۵ متر

– احداث ۱۲ عدد حوضچه شیر آلات

شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

– عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی ۹۰

درصدی در بخش سیویل

– لوله گذاری خطوط اصلی فاضلاب به طول ۵۵۰ متر

– لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول ۸۵۰ متر



پاکسازی سازه های تصفیه خانه فاضلاب

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر کوهدشت

عنوان طرح :

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر کوهدشت

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	کوهدشت	اصلاح شبکه توزیع آب	پارسه سازه گرد	۱۷/۱۱۱۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۰۰	۱,۴۴۵	۱۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۱,۷۸۵,۳۰۳	موقت ۲	۲,۴۰۲,۹۶۴,۱۲۴	۲۷	۶۳
۲	آب	کوهدشت	نیروورسانی	پویا الکتریک باختر	۱۷/۳۲۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶۰	۱,۲۰۸۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۳۳۶,۹۰۴	موقت ۱	-	۱۰۰	۷۱
۳	آب	کوهدشت	اصلاح شبکه توزیع آب	عمران گستر غرب	۱۷/۷۸۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۳۶۵	۱,۶۳۵۶	۶۵,۷۰۱,۸۴۲,۰۶۴	۵۹,۶۶۹,۰۶۸,۷۸۲	موقت ۷	۳۰,۶۸۱,۱۵۱,۶۴۸	۱۲۵	۹۱
۴	فاضلاب	کوهدشت	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کاسیت سازه زاگرس	۱۷/۱۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۸۰	۱,۲۳۹۳	۶۰,۸۴۲,۷۳۲,۴۰۳	۳۶,۱۸۷,۱۷۷,۶۱۱	موقت ۹	۱۶,۴۹۱,۴۵۶,۷۶۸	۷۲	۵۹
۵	فاضلاب	کوهدشت	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کاسیت سازه زاگرس	۱۷/۱۱۰۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۸۰	۱,۱۶۹۶	۵۸,۴۴۷,۶۰۴,۱۴۴	۳۶,۴۲۶,۳۱۷,۱۲۲	موقت ۹	۲۵,۶۸۳,۴۵۸,۰۲۹	۳۲	۶۲
۶	آب	کوهدشت	اصلاح شبکه توزیع آب	عمران خاک کوهدشت	۱۷/۳۶۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۸۰	۱,۰۹۷	۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۵۲۷,۴۰۷	موقت ۱	-	۶۵	۱۰۰
۷	آب	کوهدشت	اصلاح شبکه توزیع آب	یافته گستر عمران خرم	۱۷/۸۸۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۸۰	۱,۰۷۹۵	۵۵,۸۸۷,۳۶۹,۷۴۹	-	-	-	۰	۰

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر کوهدشت



تصفیه خانه فاضلاب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر کوهدشت



اصلاح شبکه آب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر نورآباد

عنوان طرح :

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

— اجرای شبکه توزیع آب بطول **۱۱۵۰ متر**

— نصب **۱۳۵** فقره انشعابات آب به طول **۱۰۵۰ متر**

— احداث **۲** عدد حوضچه شیرآلات



شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

— عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی **۸۰ درصدی**

در بخش سیویل

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر نورآباد

عنوان طرح :

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر نورآباد

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	نورآباد	اصلاح شبکه توزیع آب	محسن ساخت	۱۷/۱۰۵۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۴۰	۱,۵۰۱۵	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۳۹	۰
۲	فاضلاب	نورآباد	تصفیه‌خانه فاضلاب	راه و ساختمانی شماره ۱۲۳ خرم‌آباد	۱۷/۱۰۱۶۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۷۳۰	۱,۸۲۷۲	۷۰,۸۴۰,۷۴۱,۰۱۳۸	۵۷۱,۰۰۸۹,۱۳۴,۲۵۴	موقت ۲۱	۴۱۵,۷۱۷,۹۲۰,۱۰۹	۸۱	۸۱
۳	آب	نورآباد	اصلاح شبکه توزیع آب	یشت خرم اندیش	۱۷/۸۴۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۳۶۵	۱,۶۶	۷۳,۳۲۳,۳۰۶,۶۸۸	۴۱,۵۶۱,۳۰۷,۹۰۹	موقت ۳	۱۷,۳۹۱,۲۱۲,۶۶۸	۵۰	۵۷
۴	فاضلاب	نورآباد	شبکه جمع آوری فاضلاب	راه و ساختمانی شماره ۱۲۳ خرم‌آباد	۱۷/۵۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۸۰	۰,۸۹۲۸	۱۸۴,۹۸۷,۷۱۱,۹۹۲	-		-	۰	۰

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر نورآباد



تصفیه خانه فاضلاب



عنوان طرح :

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الشتر

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

— اجرای شبکه توزیع آب بطول **۲۲۹۶** متر

— احداث **۲** عدد حوضچه شیر آلات

شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

— عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با

پیشرفت فیزیکی **۵۵** درصدی در بخش سیویل



عنوان طرح :

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر الشتر

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱۲	فاضلاب	الشتر	تصفیه‌خانه فاضلاب	راه و ساختمانی شماره ۱۲۳ خرم‌آباد	۱۷/۱۲۴۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۳۶۵	۱,۶۱۸۷	۸۰۶,۱۷۶,۰۰۰,۵۵۲	۱۸۵,۷۱۶,۵۹۵,۹۶۲	موقت ۵	۵۷,۷۴۷,۵۴۸,۴۸۹	۴۲	۲۳
۱۳	آب	الشتر	اصلاح شبکه توزیع آب	نیک اسکان خاوران	۱۷/۳۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۲۰	۱/۳۵۲۹	۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۱۱۱,۱۵۰	موقت ۲	-	۱۲۵	۷۱
۱۴	آب	الشتر	اصلاح شبکه توزیع آب	فرداد بنا لرستان	۱۷/۸۷۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳۶۵	۱,۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۵۴۲,۹۱۰	موقت ۲	۷,۱۰۵,۶۰۰,۰۱۳۱	۲۱	۲۴
۱۵	آب	الشتر	ساخت و تجهیز و راه‌اندازی اتاقک چاه	دما تجهیز آب	۱۷/۶۷۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۸۰	۱,۳۶۱۲	۲۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰	۰

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الشتر



تصفیه خانه فاضلاب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر دورود

عنوان طرح :



شرح عملیات اجرایی بخش آب:

— اجرای شبکه توزیع آب بطول **۵۰۰ متر**

— احداث **۲** عدد حوضچه شیر آلات

شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

— عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی

۳۵ درصدی در بخش سیویل

— عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب با پیشرفت فیزیکی

۶۵ درصدی در بخش سیویل

— لوله گذاری خطوط اصلی فاضلاب به طول **۴۰ متر**

— لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول **۴۰۷۰ متر**

عنوان طرح :

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر دورود

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر دورود

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	فاضلاب	دورود	ساخت دال و فوتینگ فاضلابی	بابک ساروج لرستان	۱۷/۶۳۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۸۰	۱,۱۴۵	۱۲۹,۸۲۵,۸۵۱,۲۵۵	-		-	۳۰	۰
۲	آب	دورود	اصلاح شبکه توزیع آب	نگین شهر آرتین	۱۷/۵۶۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۳۶۵	۱,۰۴۲۲	۲۰,۷۳۹,۷۷۹,۹۹۶	۱۳,۴۸۳,۴۵۸,۰۱۳	موقت ۳	-	۳۴	۶۵
۳	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۶۶۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱۸۰	۱,۳۲۴۲	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۷,۰۷۱,۷۸۱	موقت ۱	-	۳۳	۹۹
۴	آب	دورود	اصلاح شبکه توزیع آب	شالوده گستر دورود	۱۷/۱۱۳۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۳۰۰	۱,۴۷۹۶	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۵,۰۸۶,۱۴۳	موقت ۲	-	۱۱	۵۶
۵	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کسری سازه زاگرس	۱۷/۴۶۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۸۰	۱,۱۰۳	۲۰,۴۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۳,۸۴۸,۳۴۹,۲۲۷	موقت ۳	۱,۳۷۰,۶۷۳,۸۵۵	۵۰	۶۷
۶	آب	دورود	تامین آب شرب	کسری سازه زاگرس	۱۷/۶۴۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۲۰	۱,۲۸۱۵	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۵۶۹,۹۹۴	موقت ۲	۱,۸۶۸,۶۸۷,۱۳۴	۳۵	۶۸
۷	آب	دورود	حصارکشی	مقاوم سازان آرات	۱۷/۷۶۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۳۶۵	۱,۱۶۵۱	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۳,۹۶۶,۵۳۲	موقت ۲	-	۲۰	۶۷
۸	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۴/۲۹۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸۰	۰,۹۱۹۲	۵۰,۰۸۳,۱۹۷,۹۶۵	۴۵,۶۸۵,۴۲۳,۳۲۰	موقت ۳	-	۱۱۸	۹۱
۹	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	بهینه سازه متین	۱۷/۳۴۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸۰	۱,۲۷۸	۷۳,۸۹۲,۳۴۸,۲۹۶	۷۱,۴۷۸,۶۶۲,۳۹۸	موقت ۱۰	-	۱۲۵	۹۷
۱۰	فاضلاب	دورود	ایستگاه پمپاژ ps۲	ویرا تدبیر آرکان	۱۷/۹۴۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۸۰	۱,۶۰۵۲	۱۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۶۵,۹۸۶,۸۰۶	موقت ۱۰	-	۵۰	۳۴
۱۱	فاضلاب	دورود	ترمیم و مرمت نوار حفاری و آسفالت	صالح طرح کارا	۱۷/۱۱۲۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۳۰	۱,۶	۹,۹۸۴,۶۳۰,۲۸۸	۱۱,۸۸۸,۴۶۱,۵۹۹	موقت ۵	-	۷۰	۱۱۹
۱۲	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	ژرف اندیشان فیروزی	۱۷/۴۲۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸۰	۱,۱۰۷۶	۱۸۹,۹۷۷,۲۱۱,۲۱۴	-		-	۳۸	۰
۱۳	آب	دورود	اصلاح شبکه توزیع آب	راه و ساختمان تعاونی شماره ۹۴ خرم‌آباد	۱۷/۵۶۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸۰	۱,۱۳۷۴	۲۵,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۳۷	۰
۱۴	آب	دورود	تکمیل خط انتقال آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۷۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۸۰	۱,۳۹	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۴۰	۰
۱۵	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۷۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۸۰	۱,۱۰۰۴	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۳۰	۰
۱۶	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	تحکیم پویش رستا	۱۷/۸۰۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۸۰	۰,۸۶۳۱	۱۳۳,۳۰۲,۳۵۹,۳۹۰	-		-	۰	۰

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر دورود



تصفیه خانه فاضلاب




ایستگاه پمپاژ فاضلاب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر دورود



شبکه فاضلاب و مرمت نوار حفاری

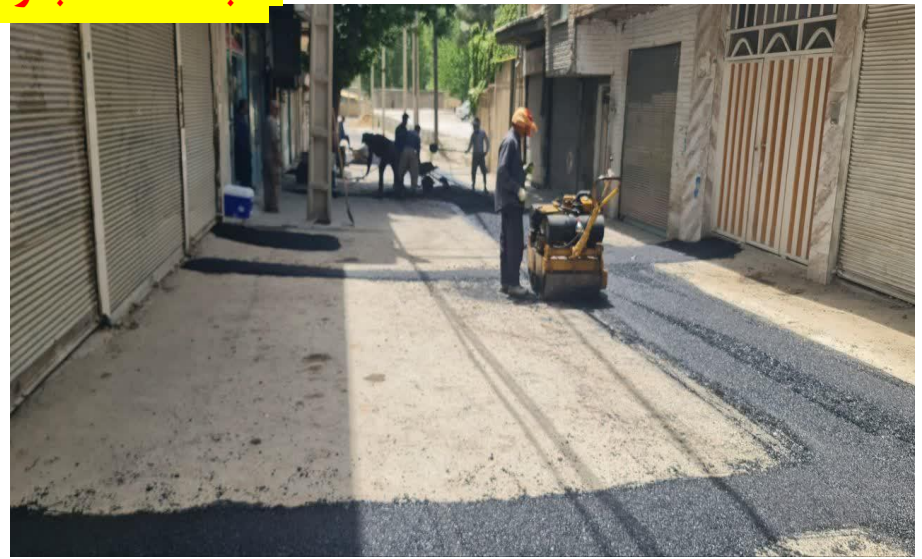

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر ازنا

عنوان طرح :

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

— اجرای شبکه توزیع آب بطول **۱۹۰۰ متر**

— نصب **۱۰** فقره انشعابات آب به طول **۴۰ متر**

— احداث **۲** عدد حوضچه شیرآلات



شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

— عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با

پیشرفت فیزیکی **۸۰** درصدی در بخش سیویل

عنوان طرح :

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر ازنا

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر ازنا

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	فاضلاب	ازنا	تصفیه‌خانه فاضلاب	توسعه گستران سپاهان	۱۷/۱۱۸۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۳۶۵	۱,۸۴۴۸	۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۷۲,۲۵۱,۸۶۷	موقت ۴	-	۵۰	۵۸
۲	آب	ازنا	اصلاح شبکه توزیع آب	پویا رهرو تالش	۱۷/۵۱۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳۶۵	۱,۱۱۲	۲۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۱,۲۹۶,۶۳۰	موقت ۱	-	۵۵	۷۳
۳	آب	ازنا	ساخت، بازسازی و مرئی سازی حوضچه‌های آب	پویا رهرو تالش	۱۷/۵۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۴۰	۱,۵۲	۴,۹۸۸,۱۲۳,۱۵۵	-	-	-	۰	۰
۴	آب	ازنا	نصب پکیج تصفیه آب	برین پالاد	۱۷/۹۳۵۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۲۴۰	۱,۱۰۸۱	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۶,۷۳۶,۰۰۰	موقت ۲	۱,۱۷۶,۷۰۲,۰۴۷	۱۰۰	۶۹
۵	آب	ازنا	اصلاح شبکه توزیع آب	کسری سازه زاگرس	۱۷/۳۸۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۴۰	۱,۴۸۶۳	۵۰,۶۲۶,۲۹۰,۷۶۹	۵۲,۱۸۷,۳۸۰,۹۸۸	موقت ۸	۷۶۱,۶۰۹,۵۹۲	۶۰	۱۰۳
۶	آب	ازنا	اصلاح شبکه توزیع آب	نیکنام ازنا گستر	۱۷/۶۳۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۳۶۵	۱,۱۳۵۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۸	۰
۷	آب	ازنا	ایستگاه پمپاژ آب کمندان	راه و ساختمان تعاونی شماره ۹۴ خرم‌آباد	۱۷/۵۶۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۰	۱,۴۹۸۳	۲۸,۴۶۶,۶۶۶,۶۷۷	-	-	-	۵۰	۰
۸	آب	ازنا	خط انتقال ایستگاه پمپاژ اضطراری	راه و ساختمان تعاونی شماره ۹۴ خرم‌آباد	۱۷/۵۹۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۲۰	۱,۵۲۷۲	۲۸,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	۵۰	۰
۹	آب	ازنا	اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب	راه و ساختمان تعاونی شماره ۹۴ خرم‌آباد	۱۷/۶۷۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۸۰	۱,۵۵۵۷	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۰
۱۰	آب	ازنا	تکمیل و راه‌اندازی پکیج تصفیه آب	رامان بنای تدبیر	۱۷/۸۳۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۸۰	۱,۶۸۲۴	۲۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر ازنا



تصفیه خانه فاضلاب



اصلاح شبکه آب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الیگودرز

عنوان طرح :

شرح عملیات اجرایی بخش آب:

- عملیات اجرایی احداث مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی
- اجرای ۱۱۰۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب

شرح عملیات اجرایی بخش فاضلاب:

- لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول ۸۵۱۰ متر
- لوله گذاری خطوط اصلی فاضلاب به طول ۱۲۵۰ متر
- ساخت ۱۲۰ عدد دال و فوتینگ منهول های فاضلابی



عنوان طرح :

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الیگودرز

پروژه‌های بخش آب و فاضلاب شهر الیگودرز

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	ترخ پیمان	مبلغ پیمان	مبلغ آخرین صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	مبلغ آخرین تعدیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	آب	الیگودرز	اصلاح شبکه توزیع آب	کاسیت راه افلاک	۱۷/۸۰۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۳۶۵	۱۰۸	۱۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۷	-	-	-	۰	۰
۲	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	پندار سازه توان	۱۷/۱۰۳۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۸۰	۰,۹۱۵	۸۱,۰۷۶,۶۴۰,۱۷۷	۱۱,۷۵۶,۱۱۲,۸۲۶	موقت ۱	-	۸۱	۱۵
۳	آب	الیگودرز	اصلاح شبکه توزیع آب	سپید صنعت پیشرو بیدستان	۱۷/۱۰۳۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۰۰	۱,۹۸	۷,۸۱۳,۰۴۷,۴۸۸	-	-	-	۴	۰
۴	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	ژرف اندیشان فیروزی	۱۷/۵۶۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۳۶۵	۰,۷۹۴۷	۴۰,۳۹۲,۴۶۵,۰۱۵	۱۷,۳۱۳,۳۹۶,۹۸۱	موقت ۴	۸۰,۴۰۲,۴۵۸,۲۸۰	۵۹	۴۳
۵	فاضلاب	الیگودرز	ترمیم و مرمت نوار حفاری و آسفالت	زیبا سازان پایدار اراک	۱۷/۹۸۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۶۰	۱,۴۹۹۶	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۰۰۸,۶۸۰۸	موقت ۱	-	۴۵	۳۳
۶	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	پندار سازه توان	۱۷/۶۰۴۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۳۶۵	۰,۸۲	۴۱,۶۲۶,۰۲۴,۴۶۰	۴۱,۰۳۲,۸۳۹,۹۶۴	موقت ۱۱	۴۴,۷۴۲,۲۷۵,۵۳۲	۶۶	۹۹
۷	فاضلاب	الیگودرز	شبکه فاضلاب و ساختمان تصفیه‌خانه	راهان دژ غدیر پارس	۱۷/۱۳۴۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۳۶۵	۰,۹۷۵۸	۴۲,۸۹۵,۰۱۳,۳۴۹	۳۲,۲۱۰,۷۶۹,۴۷۰	موقت ۱۲	۳۳,۷۰۸,۰۷۹,۰۴۳	۱۲۵	۷۵
۸	آب	الیگودرز	احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی	راه گسترگرین	۱۷/۴۲۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۳۶۵	۱,۳۹	۱۶۵,۵۰۸,۶۱۷,۴۲۸	۱۱۸,۶۴۷,۰۲۱,۶۸۲	موقت ۸	-	۷۹	۷۲
۹	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کیان پایدار ماهان	۱۷/۶۸۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۸۰	۱,۰۶	۷۰,۷۲۳,۴۴۹,۵۸۸	۶۴,۷۸۳,۹۶۱,۰۵۱	موقت ۱۰	-	۸۷	۹۲
۱۰	آب	الیگودرز	اصلاح شبکه توزیع آب	ژرف اندیشان فیروزی	۱۷/۱۱۳۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۶۵	۱/۳۹۹۹	۲۰,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰
۱۱	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کوشش سازه لرستان	۱۷/۳۶۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۸۰	۰,۹۱۹۰	۲۳۷,۵۰۵,۵۱۲,۶۵۲	۵۳,۴۹۰,۵۶۲,۹۳۴	موقت ۱	-	۵۴	۲۳
۱۲	فاضلاب	الیگودرز	ساخت دال و فوتینگ فاضلابی	ژرف اندیشان فیروزی	۱۷/۵۹۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۸۰	۱,۱۵۱۹	۱۳۲,۹۶۳,۶۹۵,۲۹۰	۱۲,۳۷۳,۱۳۳,۸۵۰	موقت ۱	-	۲۰	۹

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الیگودرز

عنوان طرح :



مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی



شبکه جمع آوری فاضلاب



خدا ما حنان کن سرانجام کار
تو خوشو دباشی و مار سگار

