



گزارشی از عملکرد سه ماهه پروژه‌های شهری
شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

و ما آب را برای شما به قدر معین از آسمان نازل کرده و آن را در زمین نگه داشتیم در
حالی‌که ما بر نابود ساختن آن نیز قادریم.

سوره مبارکه مومنون، آیه ۱۸

ایجاد تاسیسات آب شهر خرم آباد

لیست پروژه های تعریف شده و ابلاغی سال جاری در شهر خرم آباد:

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان ن	نرخ پیمان	مبلغ پیمان
۱	آب	خرم آباد	ساخت و تجهیز اتاقک چاهها	کسری سازه زاگرس	۱۷/۷۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۲۰	۱.۴۵۲۸	۲۶.۳۵۵.۷۴۳.۹۴۱
۲	آب	خرم آباد	احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی	آژنگ راه چمشک	۱۷/۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۰۰	۱.۷۹۱	۲۵۲.۵۳۱.۰۰۰.۰۰۰
۳	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	آرمان سازان آستیاگ	۱۷/۳۷۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۰	۱.۰۷۱	۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	یشت خرم اندیش	۱۷/۵۸۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳۶۵	۱.۱	۳۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۵۶۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۹۰	۱.۲۵	۹.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰
۶	آب	خرم آباد	حصارکشی تاسیسات آب استان	کسری سازه زاگرس	۱۷/۶۹۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۴۰	۱.۵۰۴۳	۱۷.۱۶۳.۶۷۶.۹۸۲
۷	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	اوژن سازه سپهر	۱۷/۶۹۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۶۵	۱.۰۳	۳۱.۵۱۸.۰۰۰.۰۰۰
۸	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	جهان ماندگار خیام	۱۷/۱۰۶۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۳۰۰	۰.۹۵۹۴	۱۲.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۹	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۱۰۷۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۲۰	۱.۰۸۹۸	۱۴.۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۰	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۱۰۷۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۸۰	۰.۹۲۴۸	۳۷.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱	آب	خرم آباد	اجرای خط انتقال آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۱۱۱۵۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸۰	۱.۱۰۱۸	۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲	آب	خرم آباد	اجرای خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۱۱۲۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۳۰۰	۱.۱۲۰۶	۳۱۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۳۷۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۹۰	۱.۳۰۹۷	۲۰.۹۵۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۴	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۳۷۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۹۰	۱.۳	۲۰.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۵	آب	خرم آباد	تخریب واحد فیلتراسیون تصفیه خانه آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۵۱۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۶۰	۱.۱۶۶۷	۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۶	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	آبادگران ولاش کوه	۱۷/۷۸۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۶۵	۱.۲	۲۰.۹۹۹.۸۲۵.۰۰۰
۱۷	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	کیان نوتاش ساز	۱۷/۸۲۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۳۶۵	۱.۳۴۷	۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۸	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	محسن ساخت	۱۷/۹۴۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳۶۵	۱/۲۹۸۱	۲۰.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹	آب	خرم آباد	حصارکشی تاسیسات آب و فاضلاب	آبادگران ولاش کوه	۱۷/۳۲۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۴۰	۱.۳۳۶۳	۱۰.۹۰۳۸.۷۷۲.۴۵۸
۲۰	آب	خرم آباد	حصارکشی تصفیه خانه آب و نگهداری	آرمان سازه شکل	۱۷/۳۵۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۸۰	۱.۱۹۸۷	۶۵.۶۸۹.۸۹۰.۷۲۳
۲۱	آب	خرم آباد	احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی	طاق ساز	۱۷/۳۶۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۰۰	۰.۹۷۷۲	۵۲۷.۷۰۶.۱۴۶.۷۰۰
۲۲	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	سازه آب بیرانشهر	۱۷/۵۳۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۸۰	۱.۰۴۸۰	۸۰.۹۶۵.۲۹۶.۴۴۰
۲۳	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۵۸۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۸۰	۱.۴۹	۱۲۶.۵۰۱.۰۰۰.۰۰۰
۲۴	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب	طنین سازه ماندگار	۱۷/۶۶۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۸۰	۱.۱۷۵۲	۶۵۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۵	آب	خرم آباد	ساخت و تجهیز اتاقک چاه	دما تجهیز آب	۱۷/۶۷۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۸۰	۱.۳۷۴۲	۲۷.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۶	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	یشت خرم اندیش	۱۷/۷۳۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۸۰	۰.۹۷	۵۴.۴۸۹.۵۱۷.۹۳۷
۲۷	آب	خرم آباد	اجرای خط انتقال آب خاتم انبیا و ولیعصر	سیبا سازان خرم	۱۷/۷۳۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸۰	۱	۲۰.۱۰۱۶.۷۷۹.۸۷۷
۲۸	آب	خرم آباد	تکمیل خط انتقال آب جلال	آرمان سازان آستیاگ	۱۷/۷۳۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸۰	۱.۱۳۳۸	۳۲۲.۹۰۷۰۲۰.۳۷۳
۲۹	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	ساروج کار بستر	۱۷/۹۸۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۸۰	۱.۱۲۶۱	۴۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۰	آب	خرم آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	تحکیم سازه سپهر افلاک	۱۷/۱۱۱۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۸۰	۰.۹۴	۳۷.۴۲۹.۰۳۵.۵۴۲
۳۱	آب	خرم آباد	ساخت و بازسازی حوضه شیرالات	بهین ناظران ایرانیان	۱۷/۱۱۳۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۲۷۰	۱.۴۰۰۱	۲۸.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۲	آب	خرم‌آباد	ساخت و بازسازی حوضه شیرآلات	راهان دژ غدیر پارس	۱۷/۱۱۴۴ ۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۲۷۰	۱.۲۶۱۶	۲۷.۲۰۳۰۸۶۶۶۱
۳۳	آب	خرم‌آباد	اصلاح شبکه توزیع آب	طراحان نصر کوثر	۱۷/۱۳۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۸۰	۱.۳۶۹۳	۱۰۹.۳۹۸.۳۸۵.۵۴۰
۳۴	فاضلاب	خرم‌آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	نگین کوشا الوند	۱۷/۱۱۱۴ ۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸۰	۰.۹۱۶۷	۴۵.۹۹۳.۳۱۰.۹۵۴
۳۵	فاضلاب	خرم‌آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	بتن آرمه لرستان	۱۷/۱۲۲۵ ۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸۰	۰.۸۹۷۳	۴۴.۹۷۱.۹۶۹.۰۶۶
۳۶	فاضلاب	خرم‌آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کوه پیماسازان لرستان	۱۷/۷۴۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸۰	۰.۸۱۸۶	۷۱.۳۳۱.۳۱۴.۸۴۳
۳۷	فاضلاب	خرم‌آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۱۱۰۰ ۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۸۰	۱/۴۱۹۹	۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۸	فاضلاب	خرم‌آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	بتن آرمه لرستان	۱۷/۴۲۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸۰	۱.۱۱۵۳	۲۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۹	فاضلاب	خرم‌آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	سازه آب بیرانشهر	۱۷/۵۳۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۸۰	۰.۸۲۲۰	۱۰۶.۸۱۷.۹۹۵.۴۳۳
۴۰	فاضلاب	خرم‌آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	مخلوط کار افلاک	۱۷/۹۳۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸۰	۱	۲۵.۷۵۵.۶۰۰.۰۰۰
۴۱	فاضلاب	خرم‌آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	سازه آب بیرانشهر	۱۷/۱۰۱۳ ۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۸۰	۰.۸۲۴	۱۰۵.۷۱۶.۱۸۱.۶۱۷
۴۲	فاضلاب	خرم‌آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کیان نوتاش ساز	۱۷/۱۹۴۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۸۰	۲.۱۲۵۳	۲۸.۴۹۹.۹۹۹.۹۹۹
۴۳	فاضلاب	خرم‌آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کیان نوتاش ساز	۱۷/۳۲۴۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۸۰	۲.۱۲۴۶	۴۲.۲۹۹.۹۹۹.۰۰۰
۴۴	فاضلاب	خرم‌آباد	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	تحکیم سازه سپهر افلاک	۱۷/۴۰۴۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸۰	۲.۲۹۷۴	۴۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

شرح عملیات اجرائی در یک سال اخیر:

- عملیات اجرایی احداث مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی فلک الدین و کوی آبشار (مسکن ملی)

- اجرای ۱۰۰۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب

- لوله‌گذاری خطوط انتقال آب به طول ۳۵۰ متر

- اجرای شبکه توزیع آب بطول ۱۱۶۰ متر

- نصب ۵۵ فقره انشعابات آب به طول ۲۹۰ متر

- احداث ۱۲ عدد حوضچه شیرآلات

- حفاری و تجهیز و نیرورسانی ۰۰ حلقه چاه آب در سطح شهر

- لوله‌گذاری خطوط اصلی فاضلاب به طول ۰۰ متر

- لوله‌گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول ۱۲۱۷ متر

- احداث ۰۰ عدد دال و فوتینگ منهول‌های فاضلابی



شبکه جمع آوری فاضلاب



عملیات غرقاب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر پلدختر

لیست پروژه های تعریف شده و ابلاغی سال جاری در شهر پلدختر:

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان
۱	آب	پلدختر	اصلاح شبکه توزیع آب	کیان پایدار ماهان	۱۷/۸۷۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳۶۵	۰.۹۵	۲۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	آب	پلدختر	خط انتقال آب	بهین ناظران ایرانیان	۱۷/۹۸۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۴۰	۰.۹۸۱	۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	آب	پلدختر	اصلاح شبکه توزیع آب	کیان پایدار ماهان	۱۷/۹۹۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۴۰	۱/۱۲۹۷	۱۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	آب	پلدختر	احداث ساختمان پیزومتری چاه	پندار سازه توان	۱۷/۵۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۸۰	۲.۲۸	۲۳,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	آب	پلدختر	اصلاح شبکه توزیع آب	عمران خاک کوهدشت	۱۷/۷۳۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸۰	۱.۱۵	۸۶,۸۲۸,۹۱۵,۹۳۷
۶	آب	پلدختر	اصلاح شبکه توزیع آب	پندار سازه توان	۱۷/۱۱۴۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۸۰	۰.۸۹۸۵	۱۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	آب	معمولان	تکمیل خط انتقال آب	پندار سازه توان	۱۷/۱۰۱۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۲۰	۱.۲۰۳۸	۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۸	آب	معمولان	اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب	رایان اکسیر گوارا	۱۷/۸۰۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۸۰	۰.۸۹۶۷	۲۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	آب	معمولان	تکمیل خط انتقال آب	ایجاد سازه خرم	۱۷/۹۹۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۸۰	۰.۹۶۴۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	فاضلاب	پلدختر	تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب	راه گسترگرین	۱۷/۳۰۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸۰	۱.۲۶	۳۷۹,۸۷۵,۲۴۴,۸۲۶

شرح عملیات اجرائی بخش آب و فاضلاب:

-لوله گذاری خطوط انتقال آب به طول ۰۰ متر

-اجرای شبکه توزیع آب بطول ۴۰۰ متر

-نصب ۰۰ فقره انشعابات آب به طول ۰۰ متر

-احداث ۰۰ عدد حوضچه شیرآلات

-عملیات اجرایی ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی ۹ درصدی در بخش سیویل

-لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول ۲۰۰ متر

ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب



ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب



خط فاضلاب زندان



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر کوهدشت

لیست پروژه های تعریف شده و ابلاغی سال جاری در شهر کوهدشت:

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان
۱	آب	کوهدشت	اصلاح شبکه توزیع آب	عمران گستر غرب	۱۷/۷۸۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۳۶۵	۱.۶۳۵۶	۶۵.۷۰۱.۸۴۲.۰۶۴
۲	آب	کوهدشت	نیروورسانی	پویا الکتریک باختر	۱۷/۳۲۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶۰	۱.۲۰۸۳	۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	آب	کوهدشت	اصلاح شبکه توزیع آب	یافته گستر عمران خرم	۱۷/۸۸۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۸۰	۱.۰۷۹۵	۵۵.۸۸۷.۳۶۹.۷۴۹
۴	آب	کوهدشت	خط انتقال و ساخت اتاقک چاه	عمارت صنعت ژبوار	۱۷/۱۰۹۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۸۰	۱.۱۱۷۸	۲۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۵	فاضلاب	کوهدشت	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کاسیت سازه زاگرس	۱۷/۱۱۰۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۸۰	۱.۱۶۹۶	۵۸.۴۴۷.۶۰۴.۱۴۴
۶	فاضلاب	کوهدشت	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کاسیت سازه زاگرس	۱۷/۱۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۸۰	۱.۲۳۹۳	۶۰.۸۴۲.۷۳۲.۴۰۳

شرح عملیات اجرایی بخش آب و فاضلاب:

-لوله‌گذاری خطوط انتقال آب به طول ۰۰ متر

-اجرای شبکه توزیع آب بطول ۳۴۱ متر

-احداث ۷ عدد حوضچه شیرآلات

-عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی ۲ درصدی در بخش سیویل

- لوله‌گذاری خطوط اصلی فاضلاب به طول ۰۰ متر

-لوله‌گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول ۰۰ متر



تصفیه خانه فاضلاب



اصلاح شبکه آب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر نورآباد

لیست پروژه های تعریف شده و ابلاغی سال جاری در شهر نورآباد:


ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان
۱	آب	نورآباد	اصلاح شبکه توزیع آب	یشت خرم اندیش	۱۷/۸۴۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۳۶۵	۱.۶۶	۷۳.۳۲۳.۳۰۶.۶۸۸
۲	آب	نورآباد	اصلاح شبکه توزیع آب	محسن ساخت	۱۷/۱۰۵۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۴۰	۱.۵۰۱۵	۷۰.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	آب	نورآباد	عملیات تکمیلی مخزن شماره ۴	مهام نظم راد	۱۷/۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱۸۰	۱.۷۳۵۱	۱۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴	فاضلاب	نورآباد	تصفیه خانه فاضلاب	راه و ساختمانی شماره ۱۲۳ خرم آباد	۱۷/۱۰۱۶۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۷۳۰	۱.۸۲۷۲	۷۰.۸۴۰.۷۰۴۱۰.۱۳۸
۵	فاضلاب	نورآباد	شبکه جمع آوری فاضلاب	راه و ساختمانی شماره ۱۲۳ خرم آباد	۱۷/۵۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۸۰	۰.۸۹۲۸	۱۸۴.۹۸۷.۷۱۱.۹۹۲

شرح عملیات اجرایی بخش آب و فاضلاب:

- اجرای شبکه توزیع آب بطول ۹۱۰ متر

- احداث ۰۰ عدد حوضچه شیرآلات

- عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی ۳ درصدی در بخش سیویل

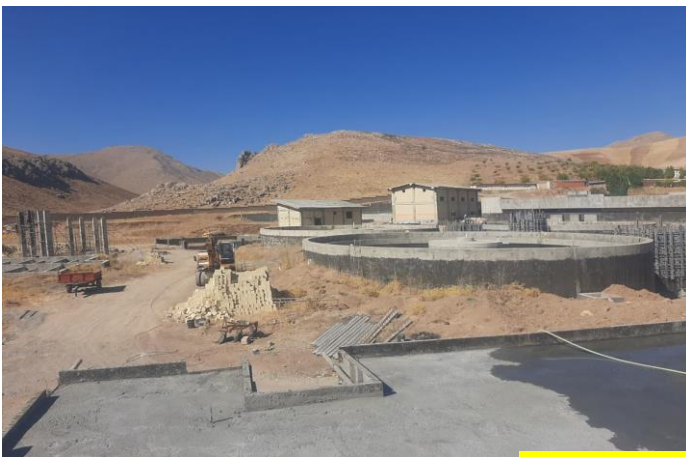

تصفیه خانه فاضلاب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الشتر

لیست پروژه های تعریف شده و ابلاغی سال جاری در شهر الشتر:

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان
۱	آب	الشتر	اصلاح شبکه توزیع آب	فرداد بنا لرستان	۱۷/۸۷۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳۶۵	۱.۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	آب	الشتر	ساخت و تجهیز و راهاندازی اتاقک چاه	دما تجهیز آب	۱۷/۶۷۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۸۰	۱.۳۶۱۲	۲۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	فاضلاب	الشتر	تصفیه خانه فاضلاب	راه و ساختمانی شماره ۱۳۳ خرم آباد	۱۷/۱۲۴۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۳۶۵	۱.۶۱۸۷	۸۰۶,۱۷۶,۰۰۸,۵۵۲

شرح عملیات اجرایی بخش آب و فاضلاب:

- اجرای شبکه توزیع آب بطول ۰۰ متر

- احداث ۰۰ عدد حوضچه شیرآلات

- عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی ۳ درصدی در بخش سیویل



تصفیه خانه فاضلاب



ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر دورود

لیست پروژه های تعریف شده و ابلاغی سال جاری در شهر دورود:

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان
۱	آب	دورود	تامین آب شرب	کسری سازه زاگرس	۱۷/۶۴۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۲۰	۱.۲۸۱۵	۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	آب	دورود	حصارکشی	مقاوم سازان آرات	۱۷/۷۶۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۳۶۵	۱.۱۶۵۱	۹.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	آب	دورود	اصلاح شبکه توزیع آب	نگین شهر آرتین	۱۷/۵۶۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۳۶۵	۱.۰۴۲۲	۲۰.۷۳۹.۷۷۹.۹۹۶
۴	آب	دورود	اصلاح شبکه توزیع آب	راه و ساختمان تعاونی شماره ۹۴ خرم آباد	۱۷/۵۶۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸۰	۱.۱۳۷۴	۲۵.۵۳۳.۰۰۰.۰۰۰
۵	آب	دورود	تکمیل خط انتقال آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۷۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۸۰	۱.۳۹	۲۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۶	آب	دورود	ساخت و بازسازی حوضچه شیرآلات	کوشش سازه لرستان	۱۷/۱۱۳۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲۷۰	۱.۴۰۱۱	۲۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۷	آب	دورود	خط انتقال آب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۱۱۵۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۸۰	۱.۳۹	۲۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۸	آب	دورود	حصارکشی مخزن ۶۵۰۰ حسین آباد	کوشش سازه لرستان	۱۷/۱۳۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۸۰	۱.۵۰۴۲	۲۷.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۹	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۲۹۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۸۰	۰.۹۱۹۲	۵۰.۰۸۳.۱۹۷.۹۶۵
۱۰	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	بهینه سازه متین	۱۷/۳۴۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸۰	۱.۲۷۸	۷۳.۸۹۲.۳۴۸.۳۹۶
۱۱	فاضلاب	دورود	ایستگاه پمپاژ ۲ps	ویرا تدبیر آرکان	۱۷/۹۴۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۸۰	۱.۶۰۵۲	۱۷۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کسری سازه زاگرس	۱۷/۴۶۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۸۰	۱.۱۰۳	۲۰.۴۸۸.۸۸۸.۸۸۸
۱۳	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۶۶۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱۸۰	۱.۳۲۴۲	۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	ژرف اندیشان فیروزی	۱۷/۴۲۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸۰	۱.۱۰۷۶	۱۸۹.۹۷۷.۲۱۱.۳۱۴
۱۵	فاضلاب	دورود	ساخت دال و فوتینگ فاضلابی	بابک ساروج لرستان	۱۷/۶۳۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۸۰	۱.۱۴۵	۱۲۹.۸۲۵.۸۵۱.۲۵۵
۱۶	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۷۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۸۰	۱.۱۰۰۴	۲۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۷	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	تحکیم پویش رستا	۱۷/۸۰۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۸۰	۰.۸۶۳۱	۱۳۳.۳۰۲.۳۵۹.۳۹۰
۱۸	فاضلاب	دورود	شبکه جمع آوری فاضلاب	کاسیت بتن افلاک	۱۷/۱۱۵۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۸۰	۱.۳۰۰۸	۲۸.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰

شرح عملیات اجرایی بخش آب و فاضلاب:

- اجرای شبکه توزیع آب بطول ۱۰۰ متر

- احداث ۰۰ عدد حوضچه شیرآلات

- عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی ۲ درصدی در بخش سیویل

- عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب با پیشرفت فیزیکی ۱ درصدی در بخش سیویل

- لوله گذاری خطوط اصلی فاضلاب به طول ۵۰۰ متر

- لوله گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول ۱۱۸۰ متر



تصفیه خانه فاضلاب



ایستگاه پمپاژ فاضلاب



شبکه فاضلاب و مرمت




ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر ازنا

لیست پروژه های تعریف شده و ابلاغی سال جاری در شهر ازنا:

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان
۱	آب	ازنا	نصب پکیج تصفیه آب	برین پالاد	۱۷/۹۳۵۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۲۴۰	۱.۱۰۸۱	۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	آب	ازنا	اصلاح شبکه توزیع آب	کسری سازه زاگرس	۱۷/۳۸۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۴۰	۱.۴۸۶۳	۵۰.۶۲۶.۲۹۰.۷۶۹
۳	آب	ازنا	اصلاح شبکه توزیع آب	نیکنام ازنا گستر	۱۷/۶۳۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۳۶۵	۱.۱۳۵۱	۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴	آب	ازنا	اصلاح شبکه توزیع آب	پویا رهرو تایش	۱۷/۵۱۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳۶۵	۱.۱۲	۳۰.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۵	آب	ازنا	ساخت، بازسازی و مرئی سازی حوضچه های آب	پویا رهرو تایش	۱۷/۵۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۴۰	۱.۵۲	۴.۹۸۸.۱۲۳.۱۵۵
۶	آب	ازنا	ایستگاه پمپاژ آب کمندان	راه و ساختمان تعاونی شماره ۹۴ خرم آباد	۱۷/۵۶۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۰	۱.۴۹۸۳	۲۸.۴۶۶.۶۶۶.۶۷۷
۷	آب	ازنا	خط انتقال ایستگاه پمپاژ اضطراری	راه و ساختمان تعاونی شماره ۹۴ خرم آباد	۱۷/۵۹۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۲۰	۱.۵۲۷۲	۲۸.۴۹۹.۹۹۹.۹۹۹
۸	آب	ازنا	اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب	راه و ساختمان تعاونی شماره ۹۴ خرم آباد	۱۷/۶۷۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۸۰	۱.۵۵۵۷	۲۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۹	آب	ازنا	تکمیل و راه اندازی پکیج تصفیه آب	رامان بنای تدبیر	۱۷/۸۳۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۸۰	۱.۶۸۲۴	۲۸.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰	آب	ازنا	طراحی و ساخت تاسیسات الکتریکال ایستگاه پمپاژ	نیکنام ازنا گستر	۱۷/۹۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۹۰		۳۹۱.۳۹۸.۵۰۸.۰۰۰
۱۱	فاضلاب	ازنا	تصفیه خانه فاضلاب	توسعه گستران سپاهان	۱۷/۱۱۸۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۳۶۵	۱.۸۴۴۸	۵۳۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲	فاضلاب	استان	تکمیل تصفیه خانه های فاضلاب ۵ شهر	مهرآز سامان	۱۷/۴۹۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۷۳۰		۲۴.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

شرح عملیات اجرایی بخش آب و فاضلاب:

- اجرای شبکه توزیع آب بطول ۴۱۰ متر
- نصب ۳۰ فقره انشعابات آب به طول ۱۲۰ متر
- احداث ۰۰ عدد حوضچه شیرآلات
- عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب با پیشرفت فیزیکی ۱ درصدی در بخش سیویل

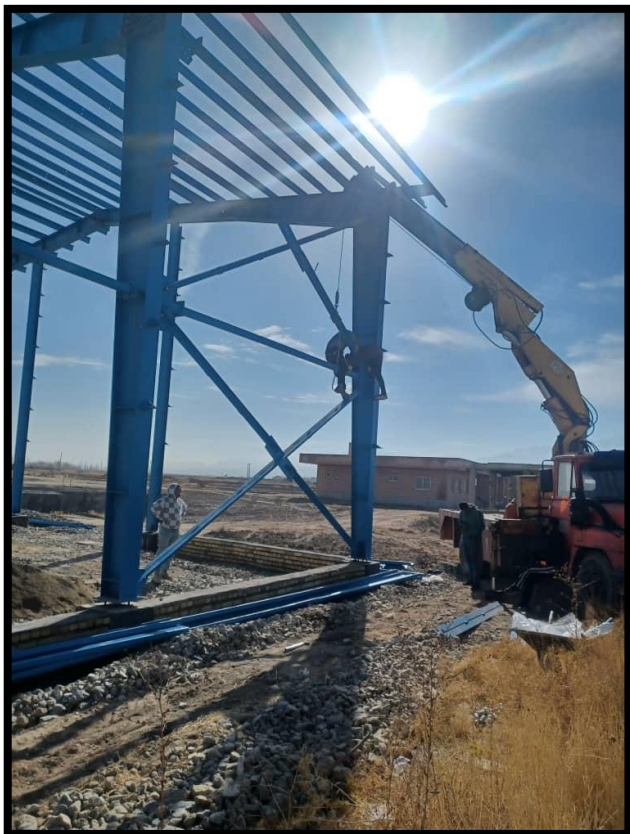

اجرای لوله کشی پکیج
ساختمان اداری و آزمایشگاه



اجرای لوله کشی برق و تاسیسات
ساختمان اداری



گرسی چینی داخلی ساختمان فیلتر پرس



اجرای وال پست ساختمان نگهبانی

ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب شهر الیگودرز


لیست پروژه های تعریف شده و ابلاغی سال جاری در شهر الیگودرز:

ردیف	بخش پروژه	شهر محل اجرا	نوع کار	نام پیمانکار	شماره پیمان	تاریخ قرارداد	مدت پیمان	نرخ پیمان	مبلغ پیمان
۱	آب	الیگودرز	احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی	راه گسترگرین	۱۷/۴۲۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۳۶۵	۱.۳۹	۱۶۵.۵۰۸.۶۱۷.۴۲۸
۲	آب	الیگودرز	اصلاح شبکه توزیع آب	کاسیت راه افلاک	۱۷/۸۰۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۳۶۵	۱.۰۸	۱۷.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۷
۳	آب	الیگودرز	اصلاح شبکه توزیع آب	سپید صنعت پیشرو بیدستان	۱۷/۱۰۳۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۰۰	۱.۹۸	۷.۸۱۳.۰۴۷.۴۸۸
۴	آب	الیگودرز	اصلاح شبکه توزیع آب	ژرف اندیشان فیروزی	۱۷/۱۱۳۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۶۵	۱/۳۹۹۹	۲۰.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰
۵	آب	الیگودرز	اصلاح شبکه توزیع آب	ژرف اندیشان فیروزی	۱۷/۳۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۸۰	۱.۷۰۹۴	۸۹.۳۵۷.۵۶۶.۵۲۵
۶	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کیان پایدار ماهان	۱۷/۶۸۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۸۰	۱.۰۶	۷۰.۷۲۳.۴۴۹.۵۸۸
۷	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	پندار سازه توان	۱۷/۱۰۳۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۸۰	۰.۹۱۵	۸۱.۰۷۶.۶۴۰.۱۷۷
۸	فاضلاب	الیگودرز	شبکه جمع‌آوری فاضلاب	کوشش سازه لرستان	۱۷/۳۶۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۸۰	۰.۹۱۹۰	۲۳۷.۵۰۵.۵۱۲.۶۵۲
۹	فاضلاب	الیگودرز	ساخت دال و فوتینگ فاضلابی	ژرف اندیشان فیروزی	۱۷/۵۹۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۸۰	۱.۱۵۱۹	۱۳۲.۹۶۳.۶۹۵.۲۹۰
۱۰	فاضلاب	الیگودرز	نصب پکیج تصفیه‌خانه فاضلاب زندان	آرکا گستر رسام	۱۷/۱۴۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۲۰		۲۰۲.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

شرح عملیات اجرایی بخش آب و فاضلاب:

- عملیات اجرایی احداث مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی
- اجرای ۱۵۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب
- لوله‌گذاری خطوط فرعی فاضلاب به طول ۱۰۰ متر

مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی

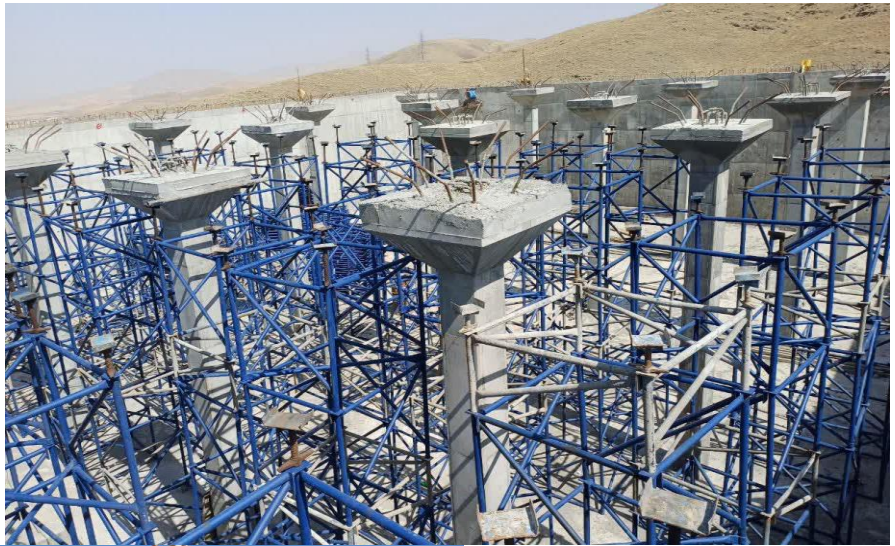

شبکه جمع آوری فاضلاب



عملکرد پروژه‌های بخش آب شرکت آب و فاضلاب استان لرستان - سه ماهه اول ۱۴۰۵

بخش آب												نام شهر
اصلاح شبکه آب	اصلاح انشعابات آب	توسعه شبکه آب	مخزن	اصلاح خط انتقال آب	توسعه خط انتقال آب	حفر چاه	تکمیل تجهیز چاه (حلقه)	تکمیل ایستگاه پمپاژ آب	حوضچه آب	ساختمان کلرزی		
متر	فقره	متر	مترمکعب	متر	متر	حلقه	حلقه	درصد	عدد	مترمربع		
۱۰۷۰	۵۵	۲۹۰	۹۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۹	۲	۰	۱۲	۰	خرم آباد	
۸۶۰	۰	۰	۶۰۰	۰	۲۵۰	۱۱۰	۰	۰	۷	۰	بروجرد	
۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دورود	
۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	الیگودرز	
۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پلدختر	
۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	معمولان	
۲۹۰	۰	۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	کوه‌دشت	
۴۱۰	۳۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	ازنا	
۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	نورآباد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	الشتر	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فیروزآباد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ویسیان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سراب‌دوره	
۴,۳۹۰	۸۵	۴۱۰	۷۴۱	۱,۱۵۰	۲۵۰	۴۵۹	۴	۱	۲۶	۰	جمع	

عملکرد پروژه های عمرانی نواحی شهری معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب در سه ماهه اول ۱۴۰۵

بخش فاضلاب										نام شهر
دال و فوتینگ	تصفیه خانه فاضلاب		ایستگاه پمپاژ فاضلاب	خط انتقال	انشعابات فاضلاب		توسعه شبکه فاضلاب اصلی	توسعه شبکه فاضلاب فرعی		
	عدد	m³/d	درصد ساختمانی	درصد	متر	متر	فقره	متر	متر	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۷	خرم آباد
۰	۹۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کوهدهشت
۰	۵۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نورآباد
۰	۴۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	الشتر
۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	پلدختر
۰	۸۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۱۸۰	دورود
۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ازنا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	الیگودرز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چمن سلطان
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۰	۳۶۶	۱,۶۵۴	۷,۲۹۱	۷,۲۹۱	بروجرد
۰	۳۰۵	۱۹	۱	۰	۱,۸۳۰	۳۶۶	۲,۱۵۴	۹,۹۸۸	۹,۹۸۸	جمع
